

# INLOOX INSIDER TAG



IT-Projekte in der Architektur –  
Erfolge die Gestalt annehmen

# QM ISO 9001:2008

**ZERTIFIKAT**

  **BRÜCKNER ARCHITEKTEN**

**ISO 9001:2008**

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen  
**Brückner Architekten GmbH  
Brückner Architekten Gesellschaft für  
Architektur, Innenarchitektur und Generalplanung mbH**

**Zertifizierter Bereich:**  
Architektur und Generalplanung

**Zertifizierter Standort:**  
D-81545 München, Gabriel-Max Straße 4

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und  
aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A13051142 erbracht.

Dieses Zertifikat ist gültig vom 15.01.2014 bis 17.12.2016      Zertifikats-Registrier-Nr.: 91213864  
Doppelat


   
DEKRA Certification GmbH  
Stuttgart, 15.01.2014

   
DAkkS  
Deutsche  
Akademie für  
Arbeitsnormen  
D 20 15075 01 01


Das Zertifikat ist gültig, wenn es von dem Zertifizierten gehalten wird und die Bedingungen des Zertifikats erfüllt sind.

DEKRA Certification GmbH • Heudwergstraße 15 • D-70566 Stuttgart • www.dekra-certification.de  
Seite 1 von 1


# QM-Handbuch in Excel - Übersicht

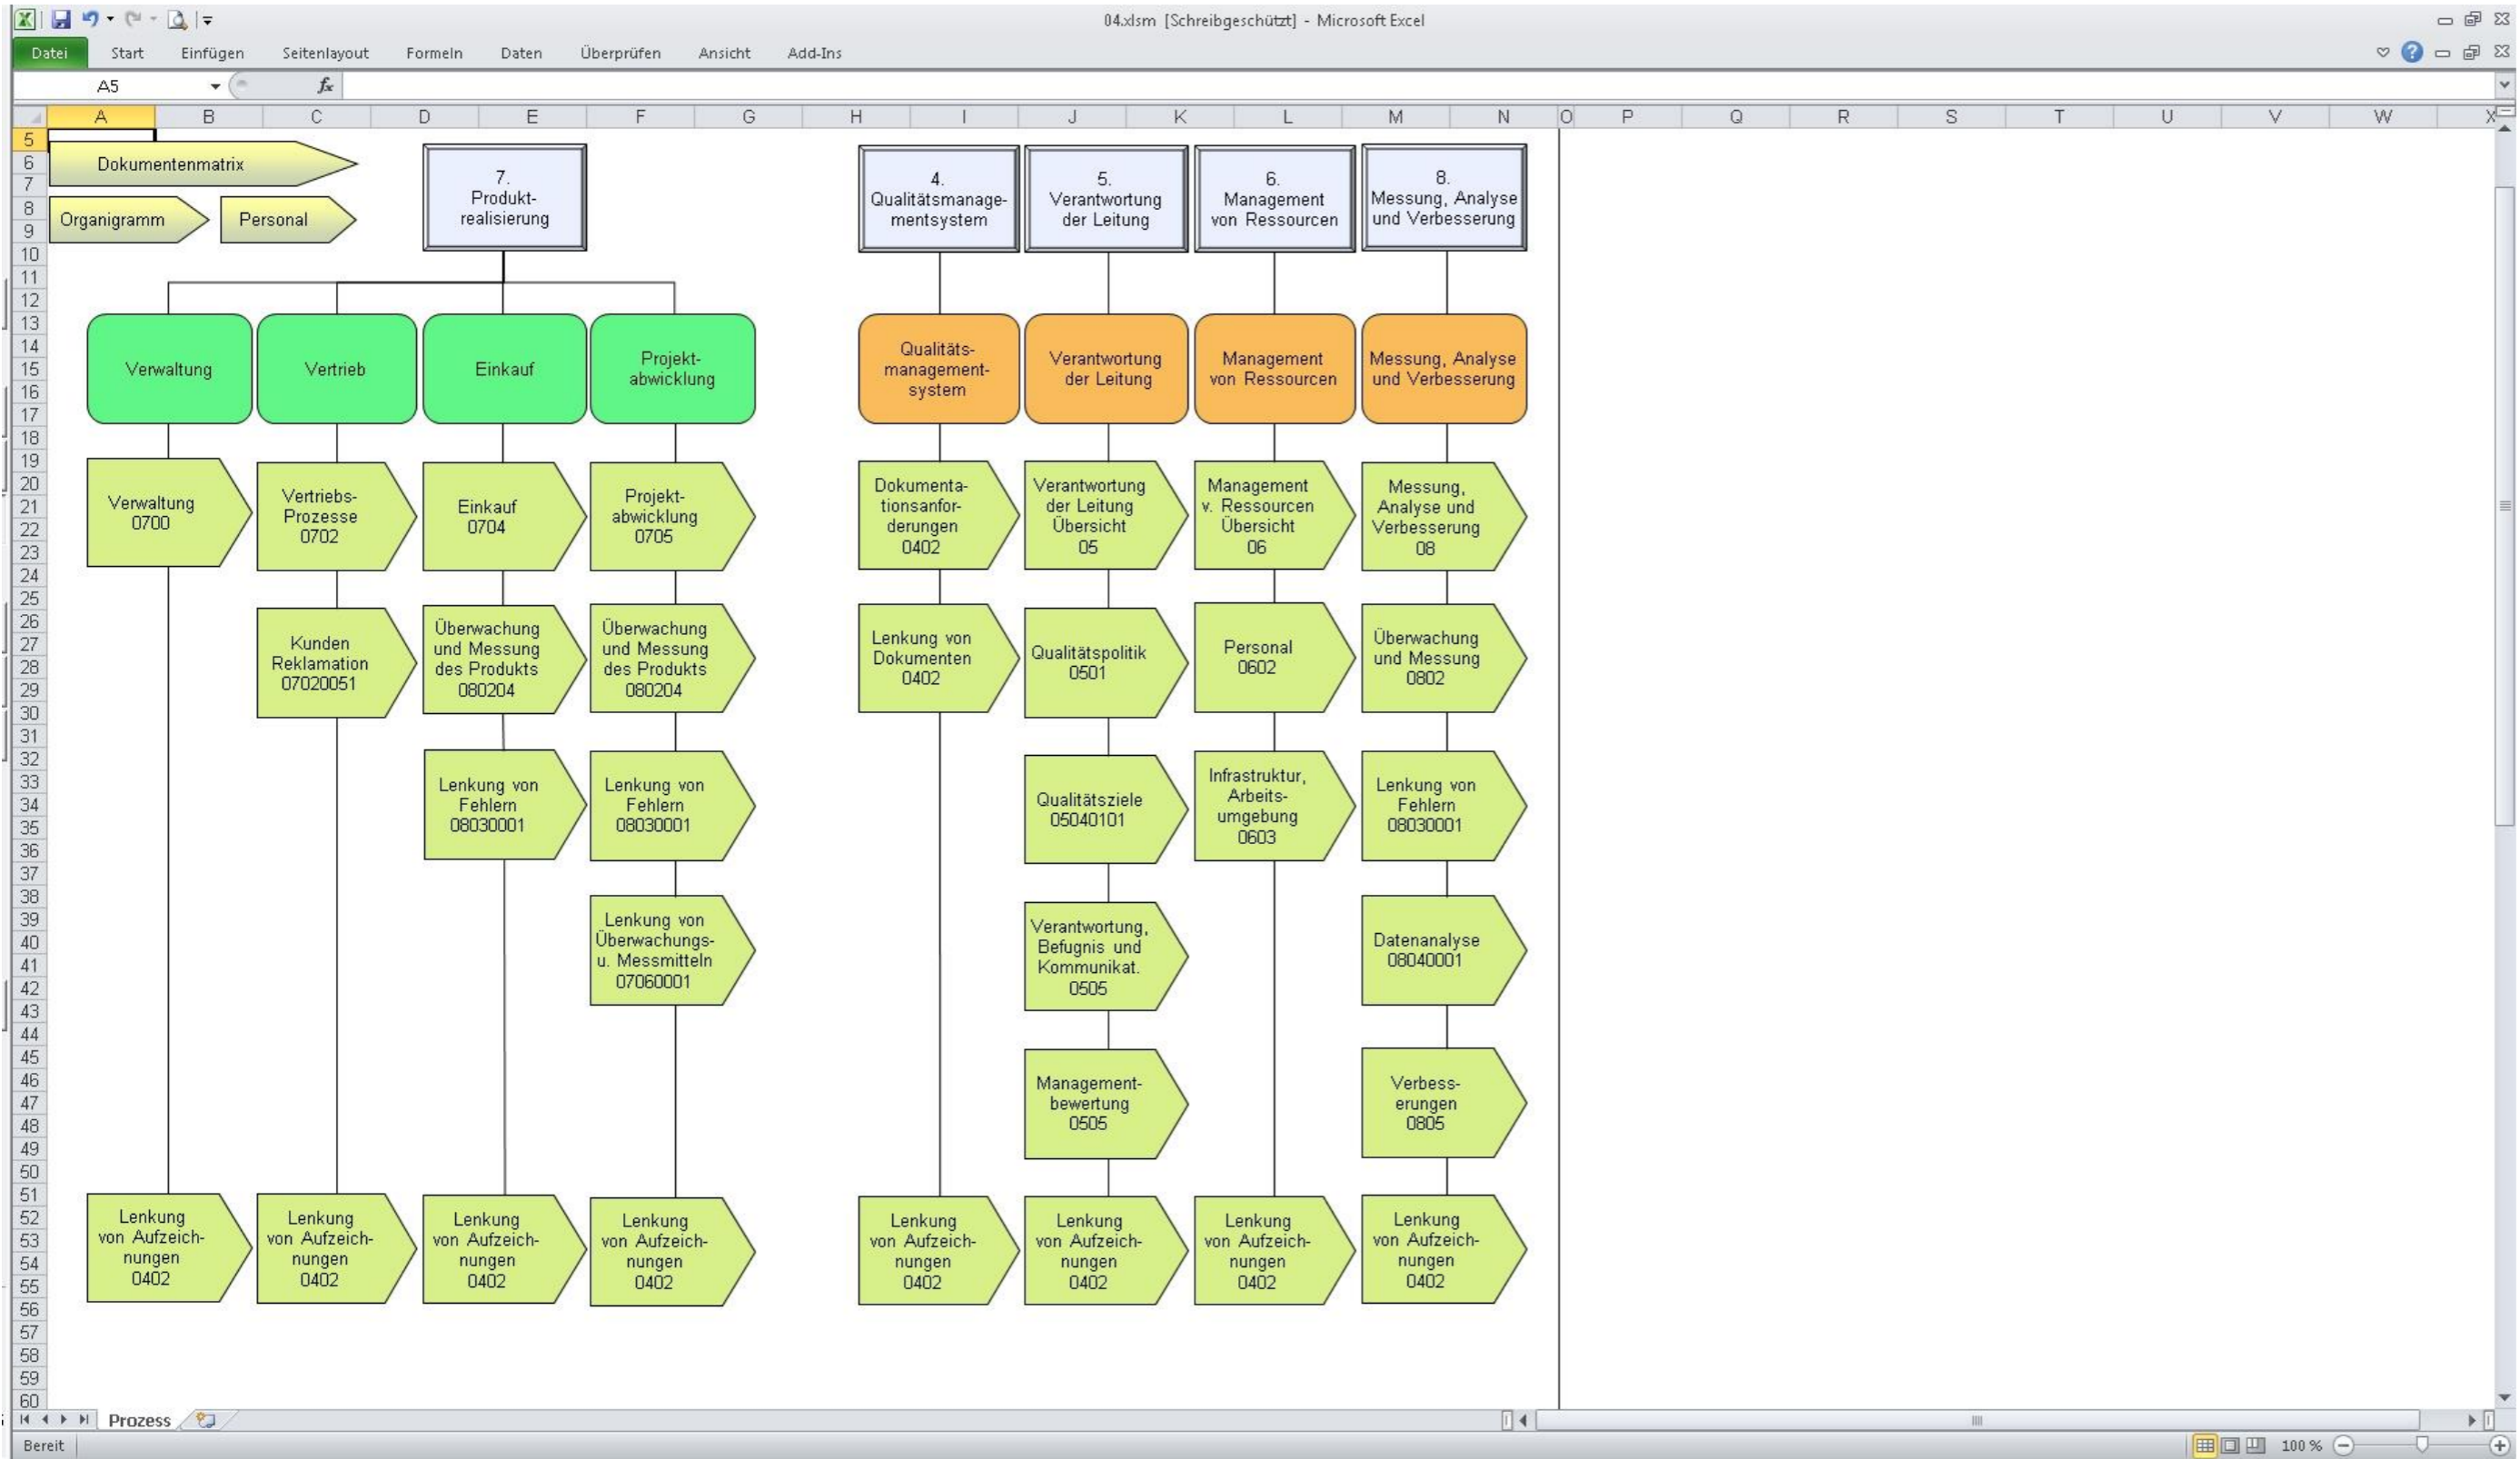

# QM-Handbuch in Excel – LPH 3 Entwurfsplanung

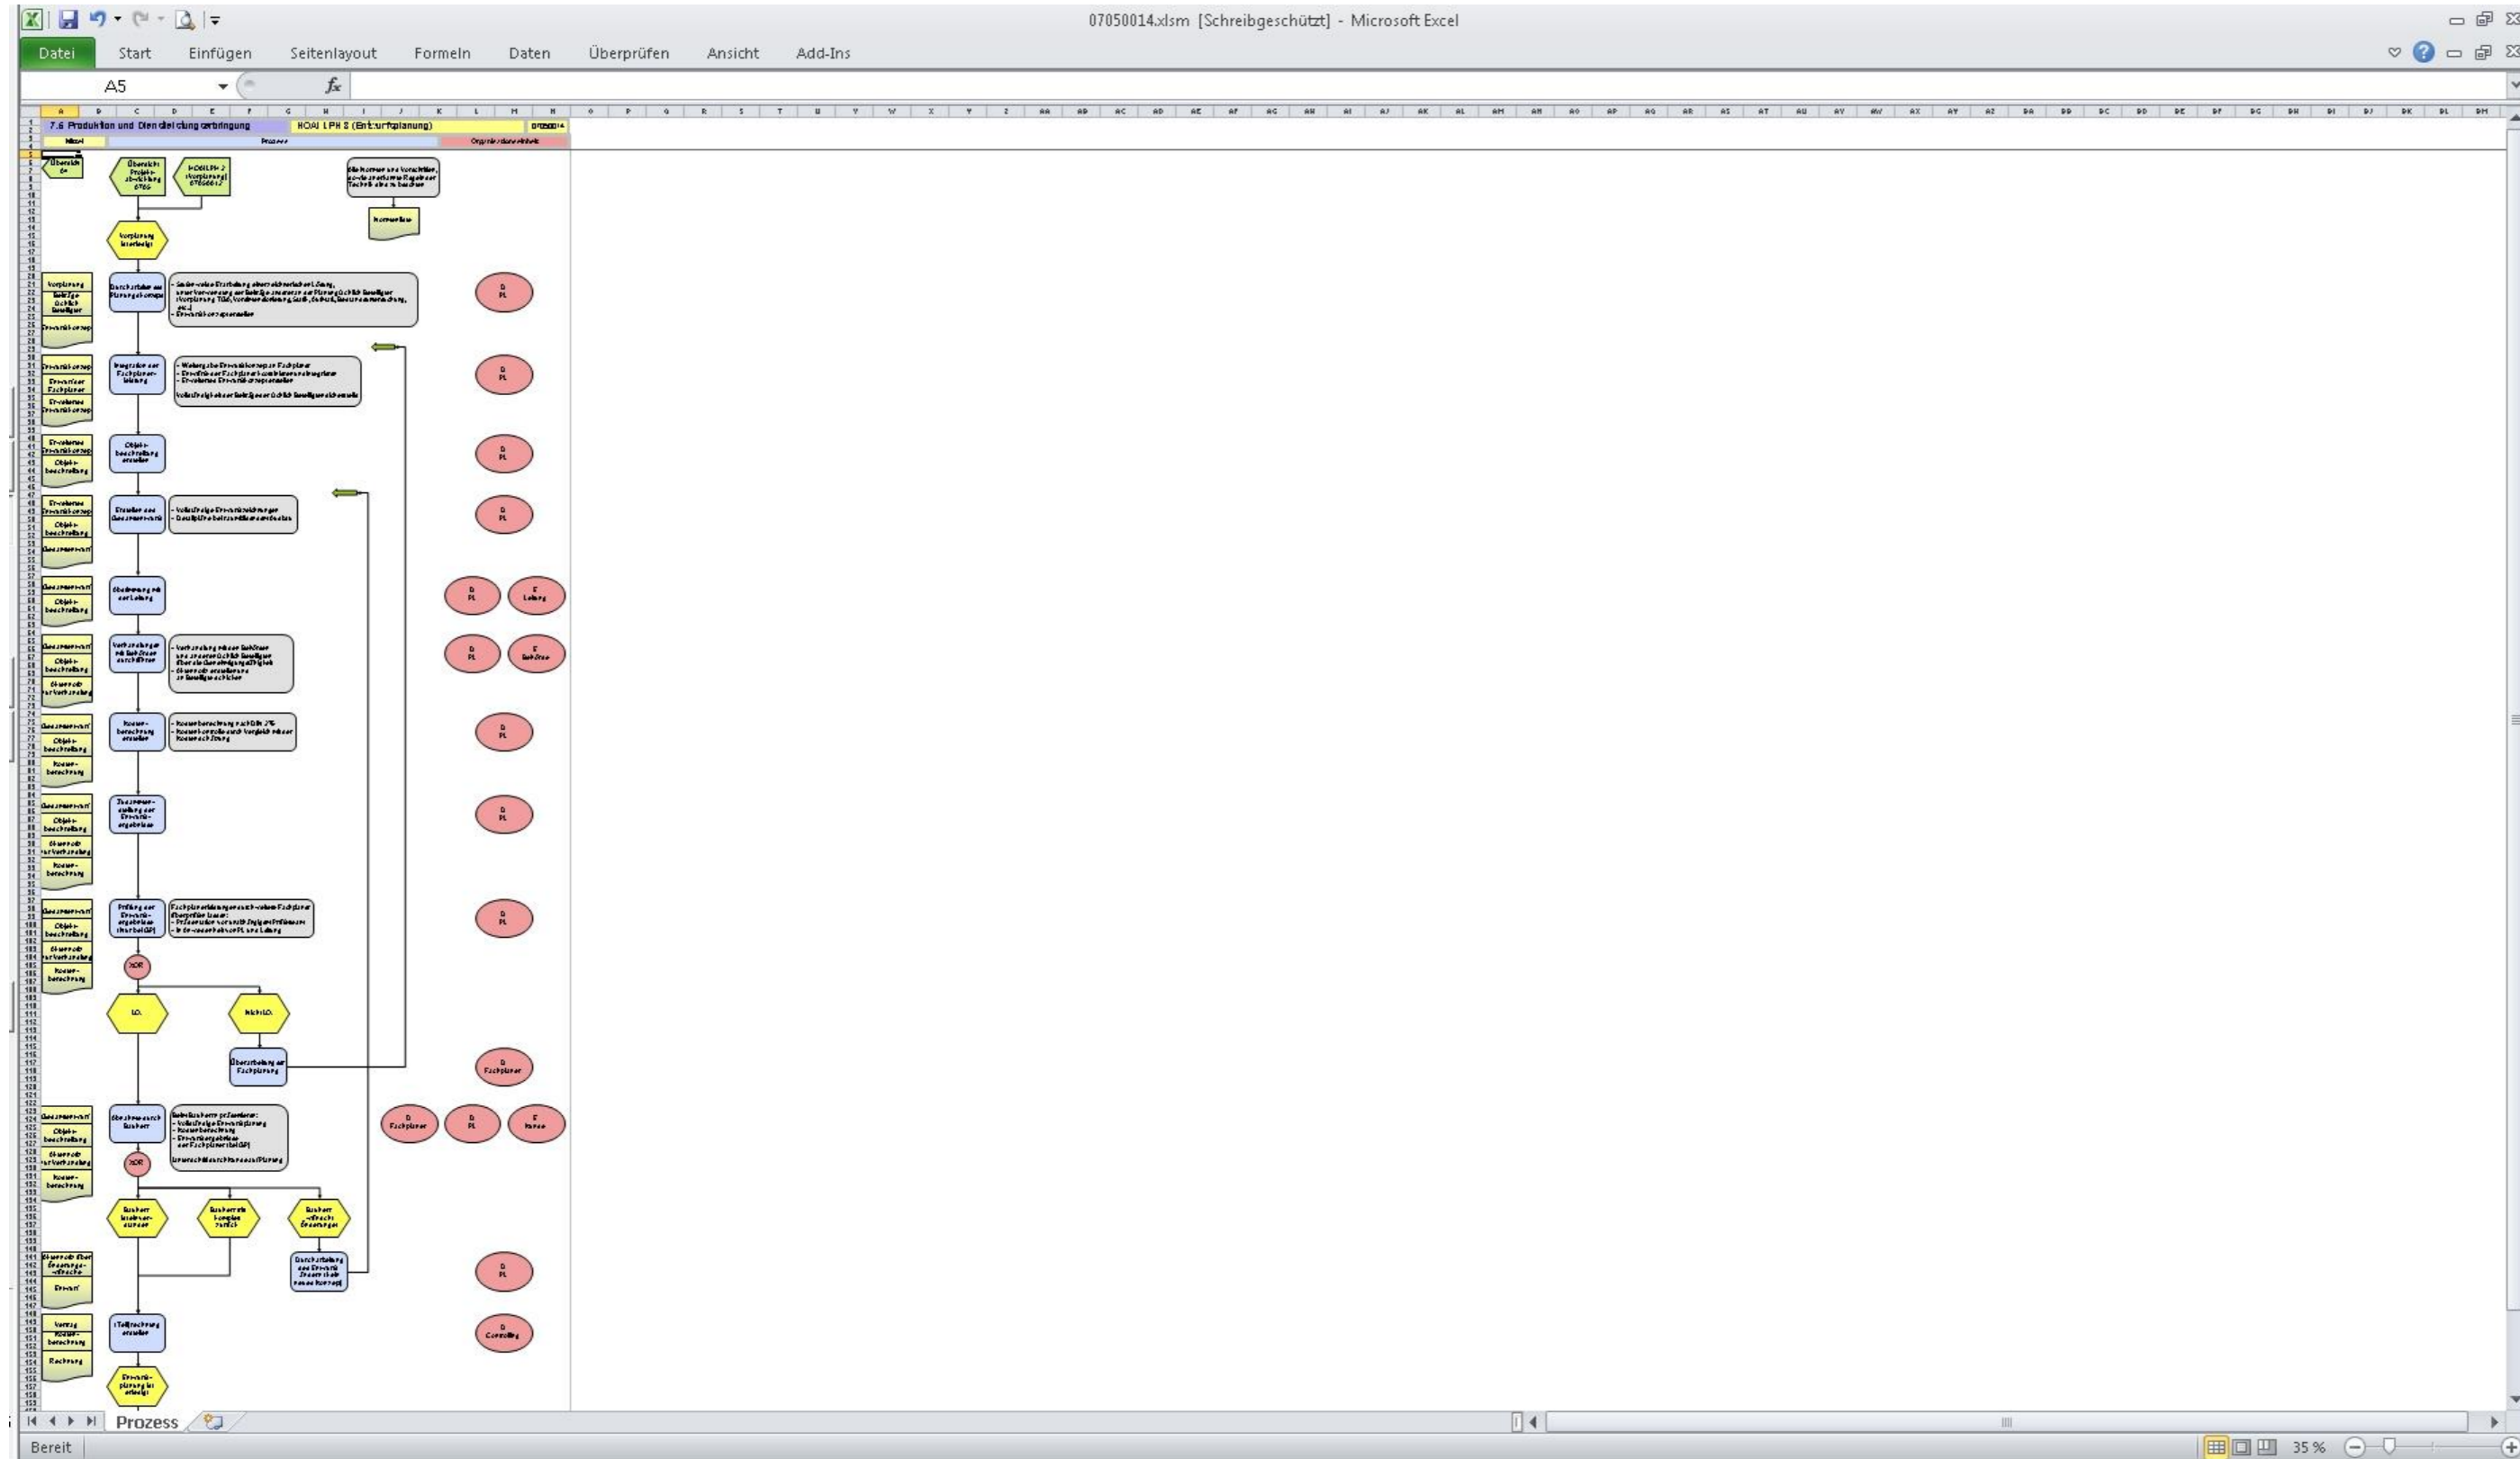

# QM-Handbuch in Excel – LPH 3 Entwurfsplanung Zoom

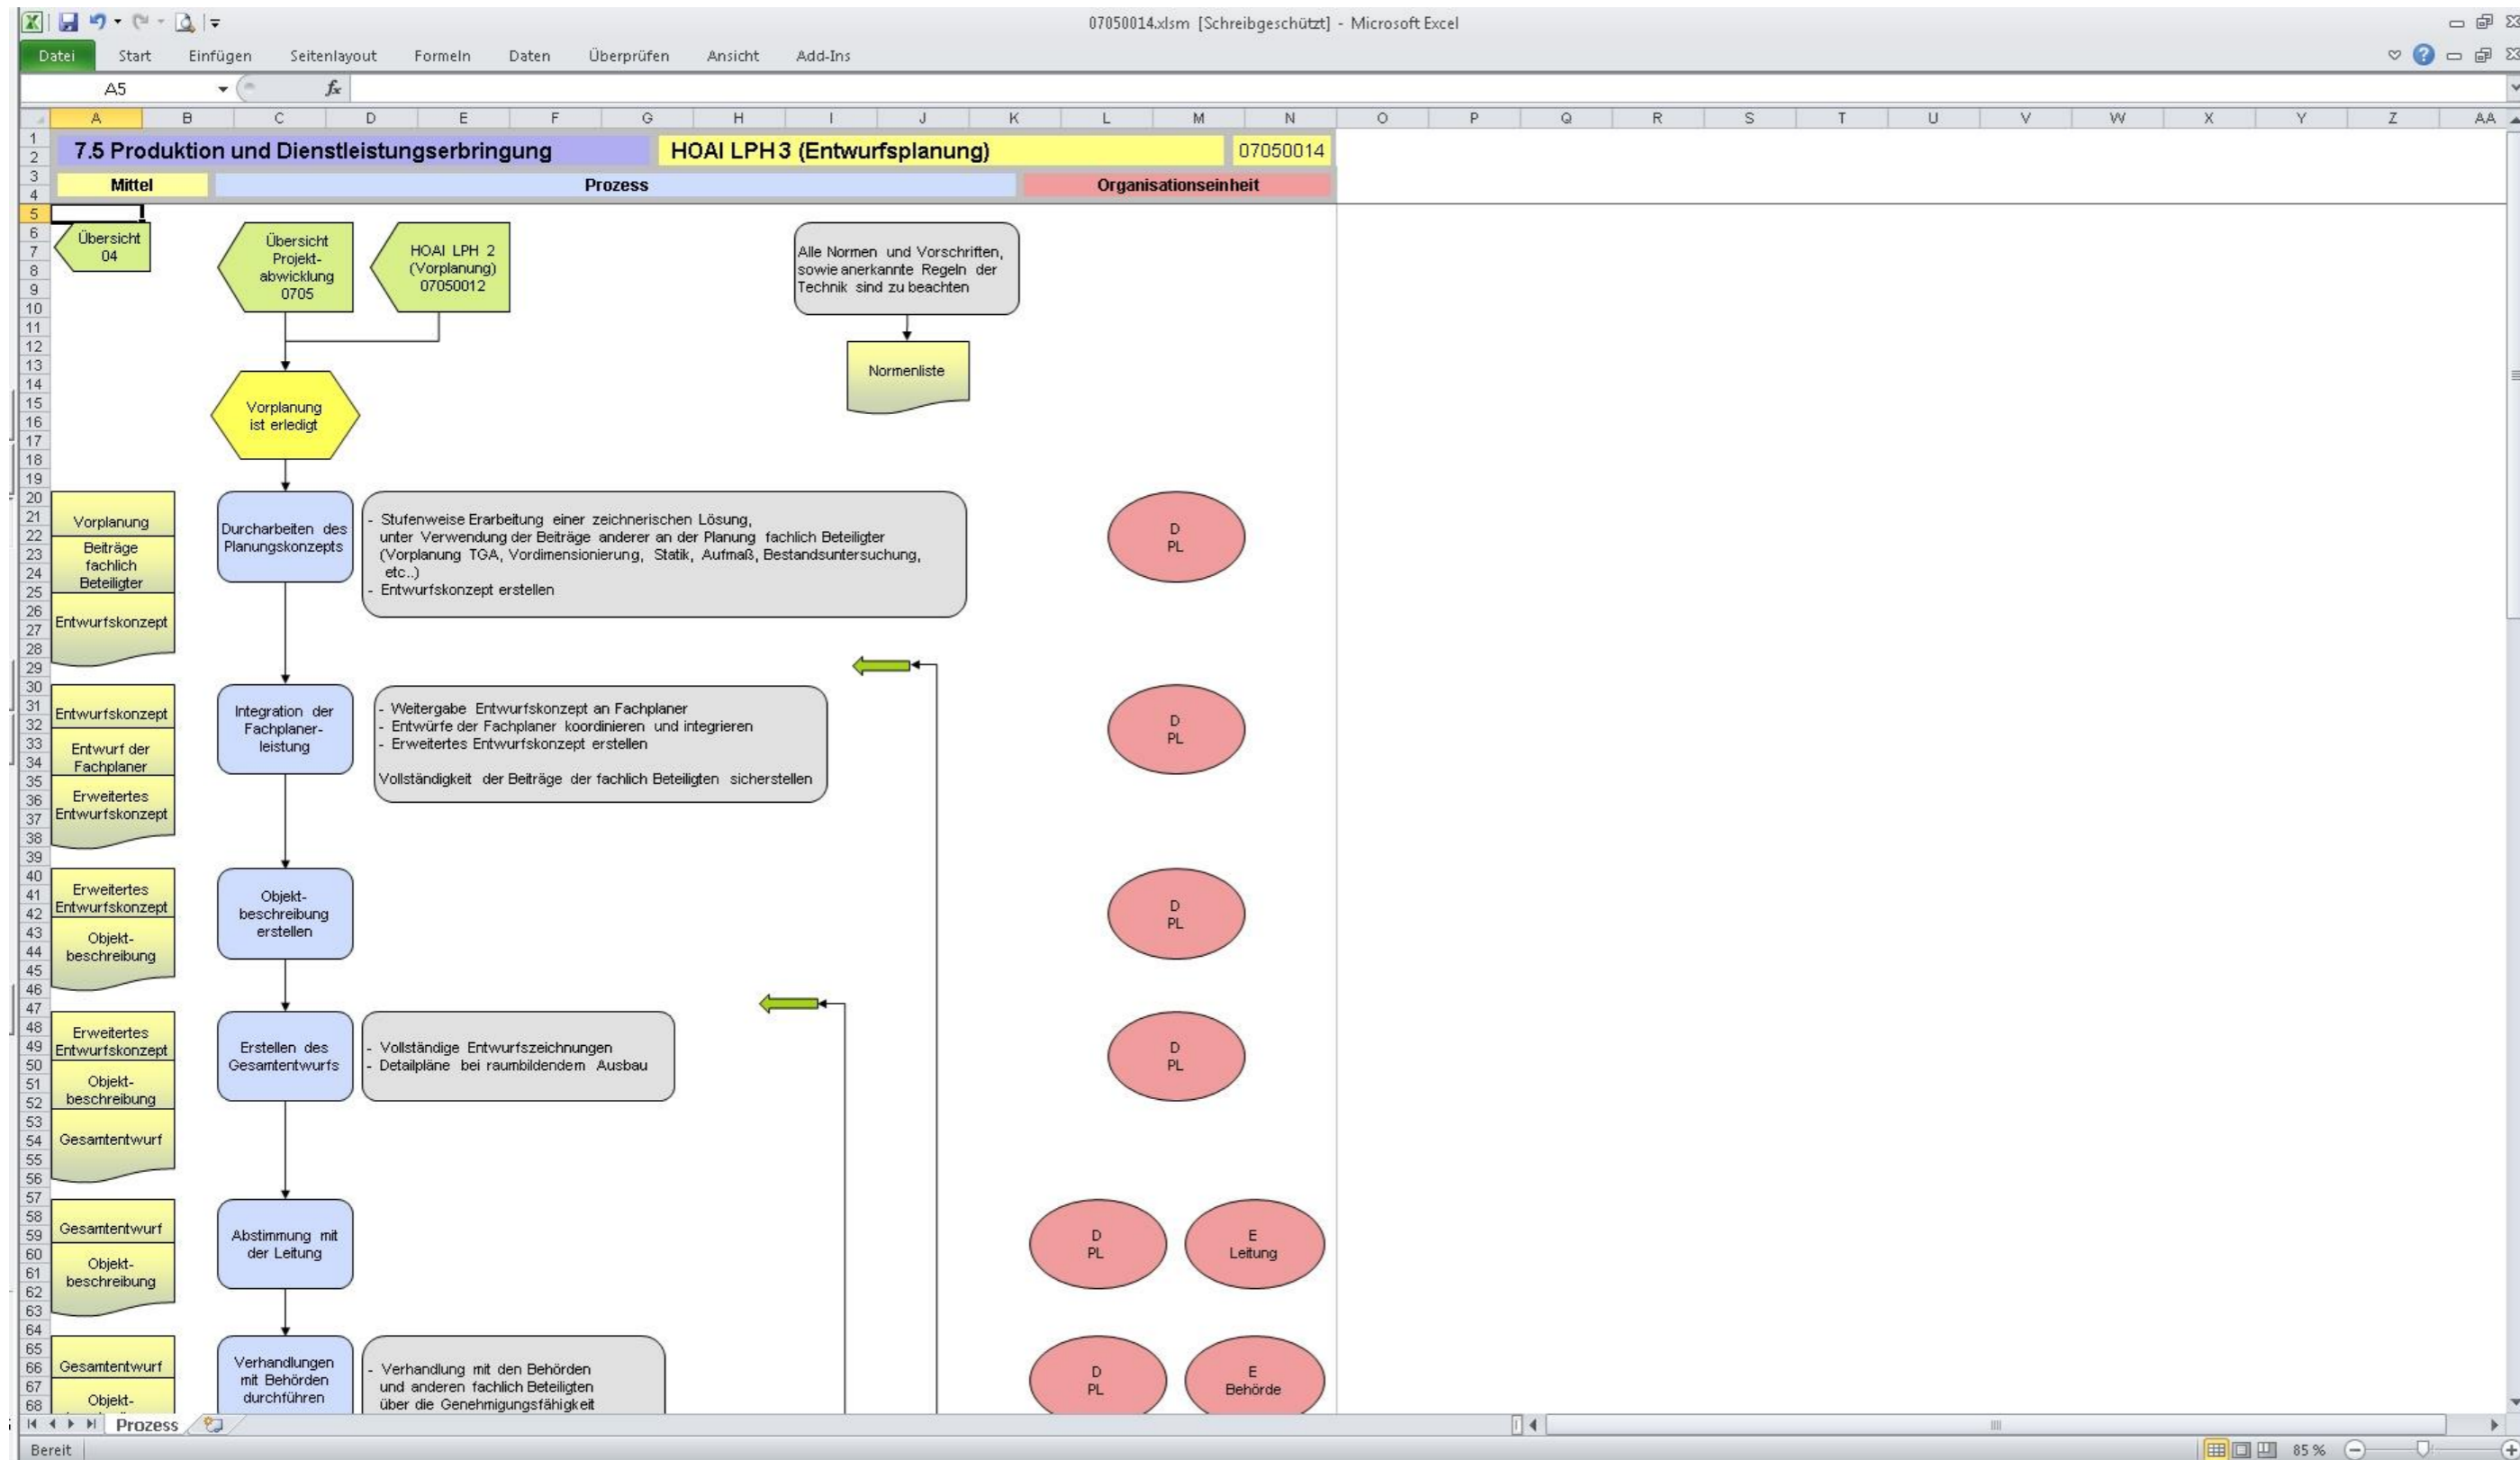

# QM-Handbuch in Excel – Evaluierung

## **Positiv:**

- Prozesse vollständig abgebildet
- Deutliche Reduktion der Fehler
- Leitfaden für MA mit wenig Erfahrung

## **Negativ:**

- Projektprozess und Handbuch zu weit entfernt
- kein automatischer Abgleich zwischen Projekt und QM
- Terminplanung und QM Prozesse losgelöst

# Einführung InLoox PM - Integration in Outlook

The screenshot displays the Microsoft Outlook interface with the 'InLoox PM' add-in integrated into the ribbon. The main window shows an email from Sabine Pfleger (Sabine.Pfleger@inloox.com) dated 08.11.2016 17:06. The email content includes:

**InLoox Insider Event morgen**  
Sabine Pfleger <Sabine.Pfleger@inloox.com>  
Gesendet: Di 08.11.2016 17:06  
An: Laurent Brueckner  
Cc: Sigrid Mokosch

Hallo Herr Brückner,  
morgen startet ja unser **InLoox** Insider Tag. Wir freuen uns schon auf Ihren Vortrag um 16:45 Uhr!

Vor Ort können Sie wählen zwischen Handmikrofon, Mikro am Pult oder Headset. Auch ein Notebook wäre da, falls Sie eine Präsentation auf USB-Stick mitbringen möchten. Unser Raum Chicago verfügt über offenes WLAN.

Wir werden schon ab dem Morgen vor Ort sein. Falls es kurzfristig noch Fragen oder Probleme gibt, erreichen Sie mich mobil unter der Nummer 0160 18 4022 x x.

Bis morgen – herzliche Grüße,  
Sabine Pfleger

**Der InLoox Insider Tag**  
Seien auch Sie dabei am 9. November  
in der neuen Microsoft Deutschland Zentrale

The interface also shows a task list on the right sidebar with items like 'Kein Datum', 'Building Design Suite Sub...', 'rendeffect GmbH - Bilanz...', 'Exposés und Kunden', 'Bewerbung als Freier Graf...', 'EXPO REAL-Gespräch 2012', 'Projektliste', 'Steuererklärung 2014', 'IHK Magazin wirtscha...', 'Heute', 'Kunden-Weihnachtsgesch...', 'Weihnachtsgeschenk für...', 'GEBURTSTAG WALTER 19.1...', 'Nächste Woche', 'SUSI Beitragsrückerst...', 'Weihnachtsfeier orga...', 'AW: Alpenwerk Gmb...', 'Dieser Monat', 'LAURENT GEBURTSTA...', 'Kontoausgleich G6/G...', 'Re: AW: AW: Heizkost...', 'Schulferien + Feierta...', 'IFS Sicherheitstechnik', and 'WICHTIG: SUSI+LAUR...'. The bottom status bar shows 'Elemente: 701' and 'Ungelesen: 602'.

# InLoox PM - Projektübersicht

Projekte - Microsoft Outlook

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Nummer	Projektname	Projektleiter	Kunde	Projekt Start	Projekt Ende	Planstart	Planende
20351	874 Schramm	Laurent Brueckner	Schramm Immobilienverwaltungs KG	09.01.2015	31.12.2015		
20561	A 10 - Alspitzstraße	Florian Wenisch	Schauer, Tanja	09.01.2015	31.12.2015	09.01.2015	03.04.2015
10013	A 199 - Arnulfstraße	Laurent Brueckner	Investa Projektentwicklungs- und Ver...	09.01.2015	31.12.2015	09.01.2015	26.03.2015
4000	ABO	Sigrid Mocosch		09.01.2015	31.12.2015	09.01.2015	09.01.2015
20081	Alpenwerk	Sigrid Mocosch		09.01.2015	31.12.2015		
99921	Altprojekte	Laurent Brueckner		09.03.2015	31.12.2015		
21121	A5 18 (Adalbert-Stifter-Str.)	Laurent Brueckner	Hausconcept GmbH	15.06.2015	31.12.2015		
20611	Astyx Campus (Wohnen)	Mitra Kashani	Astyx Campus GmbH	09.01.2015	31.12.2015	09.01.2015	22.12.2020
20221	Astyx Immobilien (Gewerbe)	Mitra Kashani	Astyx Immobilien GmbH	09.01.2015	31.12.2015	09.01.2015	08.10.2021
21041	Astyx Klärung Grundstück...	Laurent Brueckner	Astyx Immobilien GmbH	28.04.2015	31.12.2015		
20821	B 1 (Nürnberg)	Laurent Brueckner	Projektentwicklung Nürnberg GmbH & ...	08.04.2015	31.12.2015	08.04.2015	12.06.2015
21101	B 86	Laurent Brueckner	Fiduciary Capital GmbH	01.04.2015	31.12.2015		
20491	Backmas	Susanne Brückner	Backmas Backmanufaktur	09.01.2015	31.12.2015		
10012	Baronia	Laurent Brueckner	Gul, Vladimir	09.01.2015	31.12.2015		
20831	Bosch Leipzig	Carolin Köppel	Bosch Sicherheitssysteme GmbH	30.03.2015	31.12.2015	30.03.2015	25.06.2015
20731	BTV - Oberhaching	Laurent Brueckner	Bay. Tennisverband Oberhaching	09.03.2015	31.12.2015		
20621	Campus Süd	Mitra Kashani	Haupt Immobilien	09.01.2015	31.12.2015		
21081	D 7	Walter Hipp	Hempel Hausverwaltung	01.04.2015	31.12.2015		
20791	Danone	Susanne Brückner	Danone	05.03.2015	31.12.2015	05.03.2015	18.06.2015
20111	Dörnberg	Florian Wenisch	Haupt Immobilien	09.01.2015	31.12.2015		
20811	Dornier Medizintechnik	Laurent Brueckner		30.03.2015	31.03.2015	30.03.2015	02.11.2015
20771	E 2+4 - Erikastraße Geret...	Laurent Brueckner		09.03.2015	31.12.2015		
20671	Elb 18.1/18 (Musterwohnu...	Mitra Kashani	Schotten & Hansen GmbH	09.01.2015	31.12.2015	09.01.2015	01.07.2015
20681	Elb 22.35 (Musterwohnung)	Mitra Kashani	Schotten & Hansen GmbH	09.01.2015	31.12.2015		
20471	Elb 24.41 (Tiemann)	Mitra Kashani	Tiemann, Hans-Jürgen	28.02.2014	31.12.2015		
20571	Evert	Walter Hipp	Evert Etiketten GmbH	09.01.2015	31.12.2015	09.01.2015	02.03.2015
20841	Fassade Raubling	Laurent Brueckner	WB Grundstücks KG	09.04.2015	31.12.2015		
20171	G 6 - Wartenburger	Laurent Brueckner	Wartenburger, Lucas	09.01.2015	31.12.2015		
20601	GW 13 - Georg-Winkler-Str.	Laurent Brueckner	Guarnieri, Vanessa	09.01.2015	31.12.2015		
20501	Haidholzen	Laurent Brueckner		09.01.2015	31.12.2015		
20661	Halvotec	Susanne Brückner	Halvotec Information Services GmbH	09.01.2015	31.12.2015		
20001	Heißstraße	Mitra Kashani	Ratzinger, Karl	09.01.2015	31.12.2015		
21061	Hofmann	Walter Hipp	Fiduciary Capital GmbH	07.05.2015	31.12.2015		
20631	IPT	Laurent Brueckner	WHM GmbH	09.01.2015	31.12.2015		
10016	IQ Nürnberg	Laurent Brueckner	IQ Nürnberg	01.05.2015	31.12.2015		
20641	Ista (NU Space 2017)	Florian Wenisch	Ista International GmbH	09.01.2015	31.12.2015		
20871	IVG Airbus Parkplatz	Laurent Brueckner	IVG Asset Management GmbH	16.04.2015	31.12.2015		
20881	IVG Landsberger 155 Ver...	Laurent Brueckner	IVG Immobilien AG	23.04.2015	31.12.2015		
20891	IVG MWM 1250 Arcadis	Laurent Brueckner	IVG Immobilien AG	23.04.2015	31.12.2015	23.04.2015	30.10.2015
20901	IVG MWM 1250 DAK	Laurent Brueckner	IVG Immobilien AG	23.04.2015	31.12.2015		
20911	IVG MWM 1250 Laden EG	Laurent Brueckner	IVG Immobilien AG	23.04.2015	31.12.2015		
20921	IVG MWM 1250 Vermietun...	Laurent Brueckner	IVG Immobilien AG	23.04.2015	31.12.2015		



# InLoox PM – Beispiel Zeiterfassung

Elb 18.1/18 (Musterwohnung) (20671) - InLoox PM Projekt

Projekt durchsuchen...

Neu Bearbeiten Löschen Kopieren Einfügen Kennzeichnung Erinnerung anlegen Zeiterfassung


Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Startdatum	Enddatum	Beschreibung	Dauer (Stunden) (965,37 Stunden)	Ausgeführt von	Kennzei...	Verknüpfte Dokumente	Abrechenbar	...
13.01.2015 08:30	13.01.2015 10:30	Vorbereitung, Telko, Nachbereitung	2,00 Stunden	Laurent Brueckner			<input checked="" type="checkbox"/>	
13.01.2015 17:12	13.01.2015 18:12	Telko, Unterlagen vorbereitet	1,00 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
13.01.2015 17:13	13.01.2015 20:03	Planungsbesprechung S & H	2,83 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
19.01.2015 17:13	19.01.2015 17:58	Besprechung per Telko mit Herrn Bethge und Hansen wegen weiteres Vorgehensweise	0,75 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
19.01.2015 17:30	19.01.2015 19:30	Vorbereitung, Telko, Nachbereitung	2,00 Stunden	Laurent Brueckner			<input checked="" type="checkbox"/>	
20.01.2015 17:14	20.01.2015 20:14	Terminplanun Muterwohnung, E-Mail Hellmuth, Outlookeinladung	3,00 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
21.01.2015 11:00	21.01.2015 13:00	Erarbeitung und Durchsprache Terminplanung	2,00 Stunden	Laurent Brueckner			<input checked="" type="checkbox"/>	
21.01.2015 16:00	21.01.2015 17:00	Telko Durchsprache Terminplan	1,00 Stunden	Laurent Brueckner			<input checked="" type="checkbox"/>	
26.01.2015 08:11	26.01.2015 18:41	Terminplan aufgestellt, Abstimmung Hellmuth, Vorbereitung Telefonkonfernez	10,50 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
27.01.2015 08:12	27.01.2015 11:42	Terminplan, Vorbereitung Telko	3,50 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
27.01.2015 17:30	27.01.2015 19:30	Vorbereitung, Telko, Nachbereitung	2,00 Stunden	Laurent Brueckner			<input checked="" type="checkbox"/>	
02.02.2015 08:12	02.02.2015 09:42	Protokoll Hellmuth gelesen und mit ihm gesprochen, MindMap überarbeitet	1,50 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
04.02.2015 08:13	04.02.2015 09:43	Telefonat mit Hellmuth und Köhnken wg. Stand der Planung und Detail S&H	1,50 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
05.02.2015 17:01	06.02.2015 00:01	Prüfung 3D Modelling; Prüfung Bauteilkatalog, Details, Planung	7,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
05.02.2015 17:30	05.02.2015 19:30	Besprechung weitere Vorgehensweise	2,00 Stunden	Laurent Brueckner			<input checked="" type="checkbox"/>	
06.02.2015 08:14	06.02.2015 08:44	Telko mit Herrn Bethge	0,50 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
06.02.2015 09:00	06.02.2015 11:00	Vorbereitung, Telko, Nachbereitung	2,00 Stunden	Laurent Brueckner			<input checked="" type="checkbox"/>	
06.02.2015 17:02	07.02.2015 01:02	Integration Planung Citerio in BIM, BIM Modelling Trockenbau	8,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
09.02.2015 17:03	10.02.2015 03:03	BIM Modelling Trockenbau, DWG Prüfung und Datentausch	10,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
10.02.2015 17:04	11.02.2015 03:04	BIM Modelling Trockenbau und Bodenaufbauten, Integration Details Citerio	10,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
12.02.2015 08:14	12.02.2015 11:14	Telefonat mit Hellmuth wg. Strategie für Montag, Telefonat mit Bethge und IB Jäger wegen Abga...	3,00 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
12.02.2015 17:04	12.02.2015 20:04	BIM Modelling Trockenbau	3,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
16.02.2015 17:05	17.02.2015 02:05	Einlesen 3D Scan, Telefonkonferenz, 3D Modelling	9,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
16.02.2015 17:30	16.02.2015 19:30	Vorbereitung, Telko Planungsstand, Nachbereitung	2,00 Stunden	Laurent Brueckner			<input checked="" type="checkbox"/>	
17.02.2015 17:06	18.02.2015 01:06	3D Modelling Wände inkl. UK gem. Leitdetails	8,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
18.02.2015 08:19	18.02.2015 10:49	Planungsbesprechung mit Hellmuth und Bauleiter von Musterwohnung	2,50 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
18.02.2015 17:10	19.02.2015 02:10	3D Modelling Boden/Wand gem. Leitdetails	9,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
19.02.2015 08:20	19.02.2015 10:35	Klärung Datenaustausch, Datenformat, Gespräch mit Walter wegen Vertrag	2,25 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
23.02.2015 17:10	24.02.2015 02:10	3D Modelling, Koordination Schotten u. Hansen, 2D Planung Details	9,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
24.02.2015 17:11	24.02.2015 19:11	2D Detailplanung Koordination	2,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
02.03.2015 08:30	02.03.2015 15:15	Wandtypen, Wandansichten	6,75 Stunden	Carolin Köppel			<input checked="" type="checkbox"/>	
03.03.2015 08:30	03.03.2015 15:45	Wandtypen, Wandansichten	7,25 Stunden	Carolin Köppel			<input checked="" type="checkbox"/>	
04.03.2015 08:22	04.03.2015 18:52	Messe in Nürnberg, Gespräch mit Knauf, mit Herrn Knoll, Scholz, bzgl. Decken Böden und Wände	10,50 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
05.03.2015 08:22	05.03.2015 16:52	Planungsbesprechung SH, Festlegung der Arbeitspakete	8,50 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
05.03.2015 09:00	05.03.2015 14:00	Besprechung Schotten und Hansen / Thorwart / Hinrichs	5,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
06.03.2015 08:00	06.03.2015 14:00	Planung 2D Überprüfung 3D Modell, Anpassung Bodenaufbau, Abstimmung Schallschutz / Brandsc...	6,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
06.03.2015 08:30	06.03.2015 15:30	Wandtypen, Wandansichten	7,00 Stunden	Carolin Köppel			<input checked="" type="checkbox"/>	
09.03.2015 09:00	09.03.2015 14:00	Vorbereitung Besprechung Hamburg / Prüfen der FLB / HLS/ ELT Objektlisten	5,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
09.03.2015 10:45	09.03.2015 16:30	Wandtypen, Wandansichten	5,75 Stunden	Carolin Köppel			<input checked="" type="checkbox"/>	
10.03.2015 07:00	10.03.2015 11:00	Besprechung Hamburg	4,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
10.03.2015 09:00	10.03.2015 14:15	Wandtypen, Wandansichten	5,25 Stunden	Carolin Köppel			<input checked="" type="checkbox"/>	
10.03.2015 16:01	10.03.2015 20:01	Hamburg	4,00 Stunden	Mitra Kashani			<input checked="" type="checkbox"/>	
11.03.2015 09:00	11.03.2015 15:00	3 D Modell Bodenschichtenaufbau	6,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
11.03.2015 15:00	11.03.2015 18:15	Wandtypen, Wandansichten	3,25 Stunden	Carolin Köppel			<input checked="" type="checkbox"/>	
12.03.2015 08:00	12.03.2015 16:00	Koordination Schotten und Hansen / Knauf / Schallschutz / Bauphysik	8,00 Stunden	Florian Wenisch			<input checked="" type="checkbox"/>	
12.03.2015 08:00	12.03.2015 14:15	Wandansichten	6,25 Stunden	Carolin Köppel			<input checked="" type="checkbox"/>	


# Elbphilharmonie – Digitales Bauen




# Elbphilharmonie – Prozess Digitales Bauen

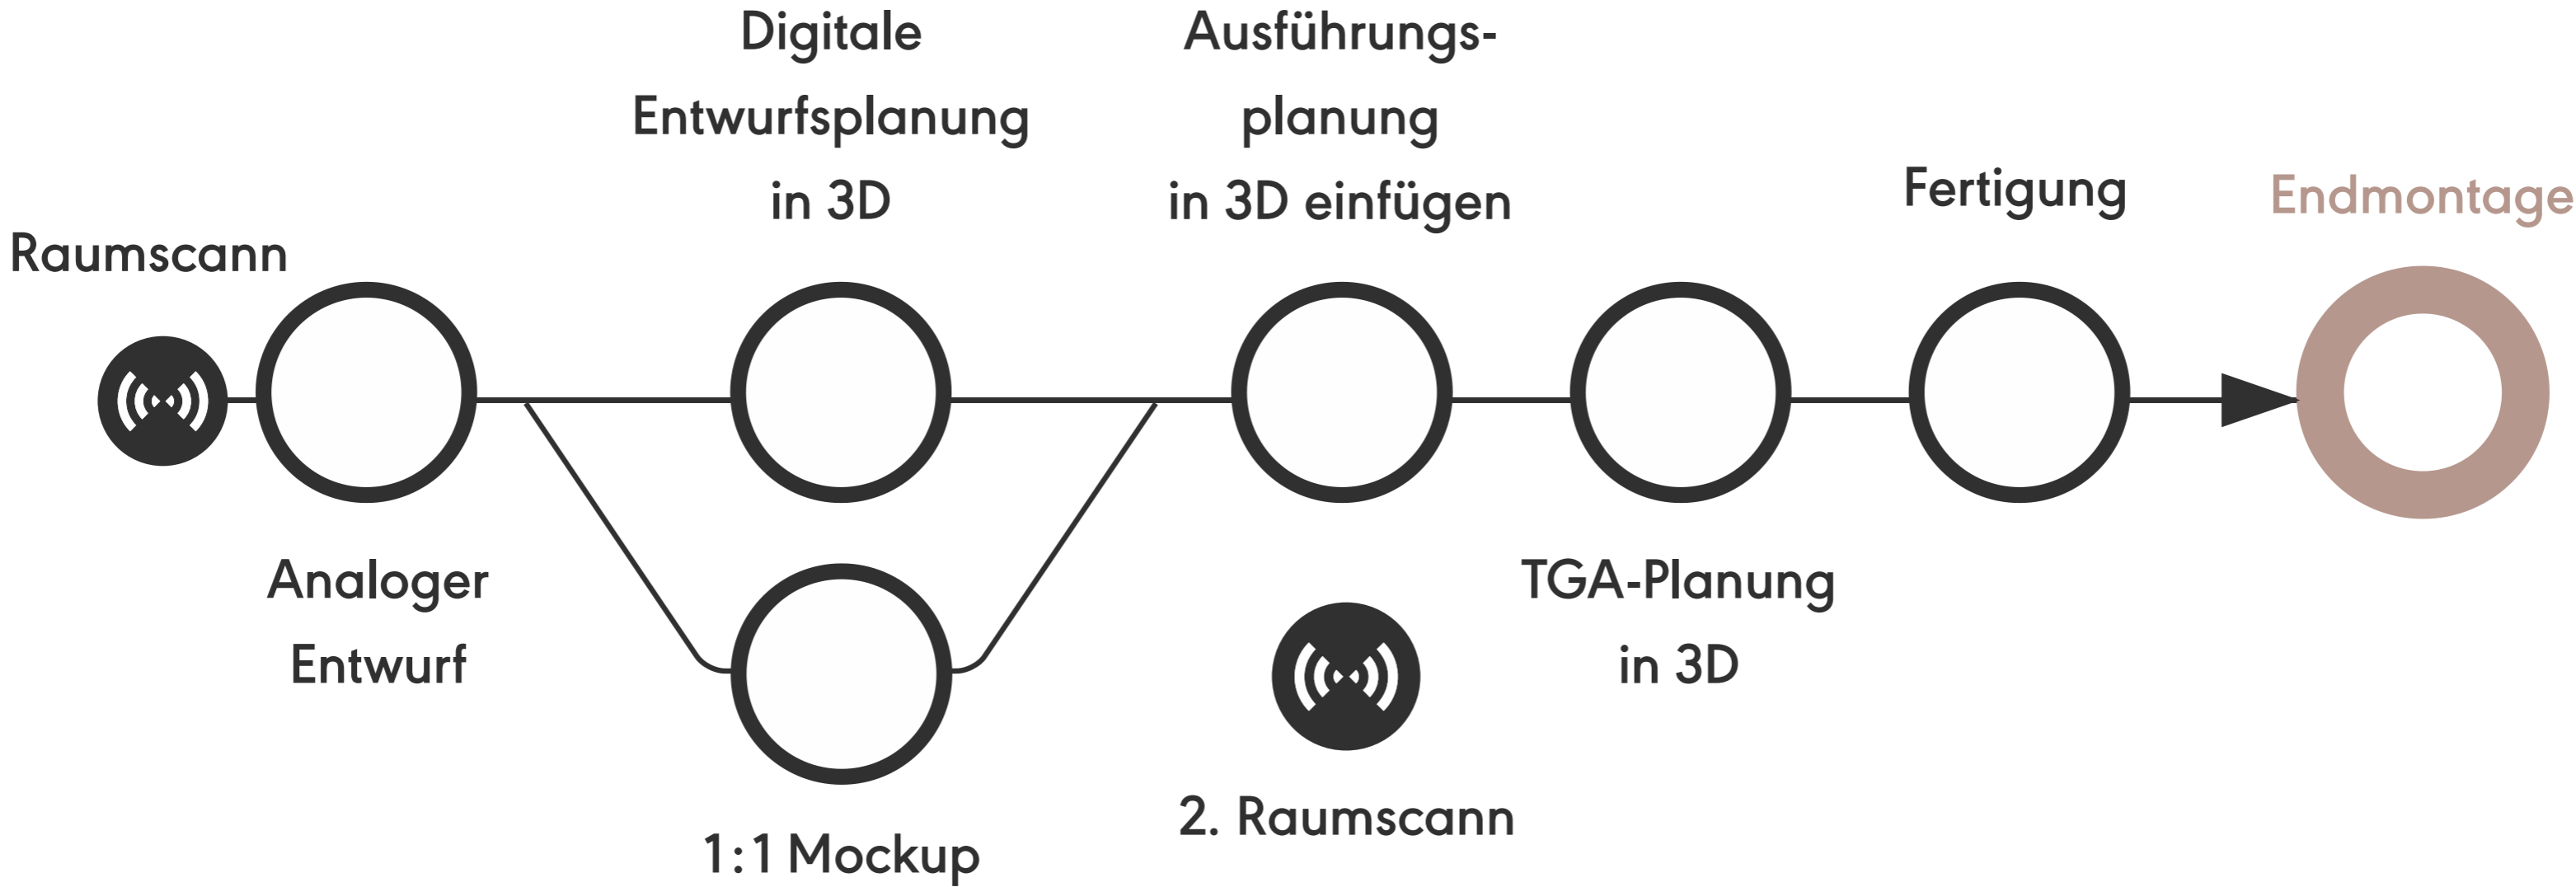


# Elbphilharmonie – Raumscan Digitales Bauen

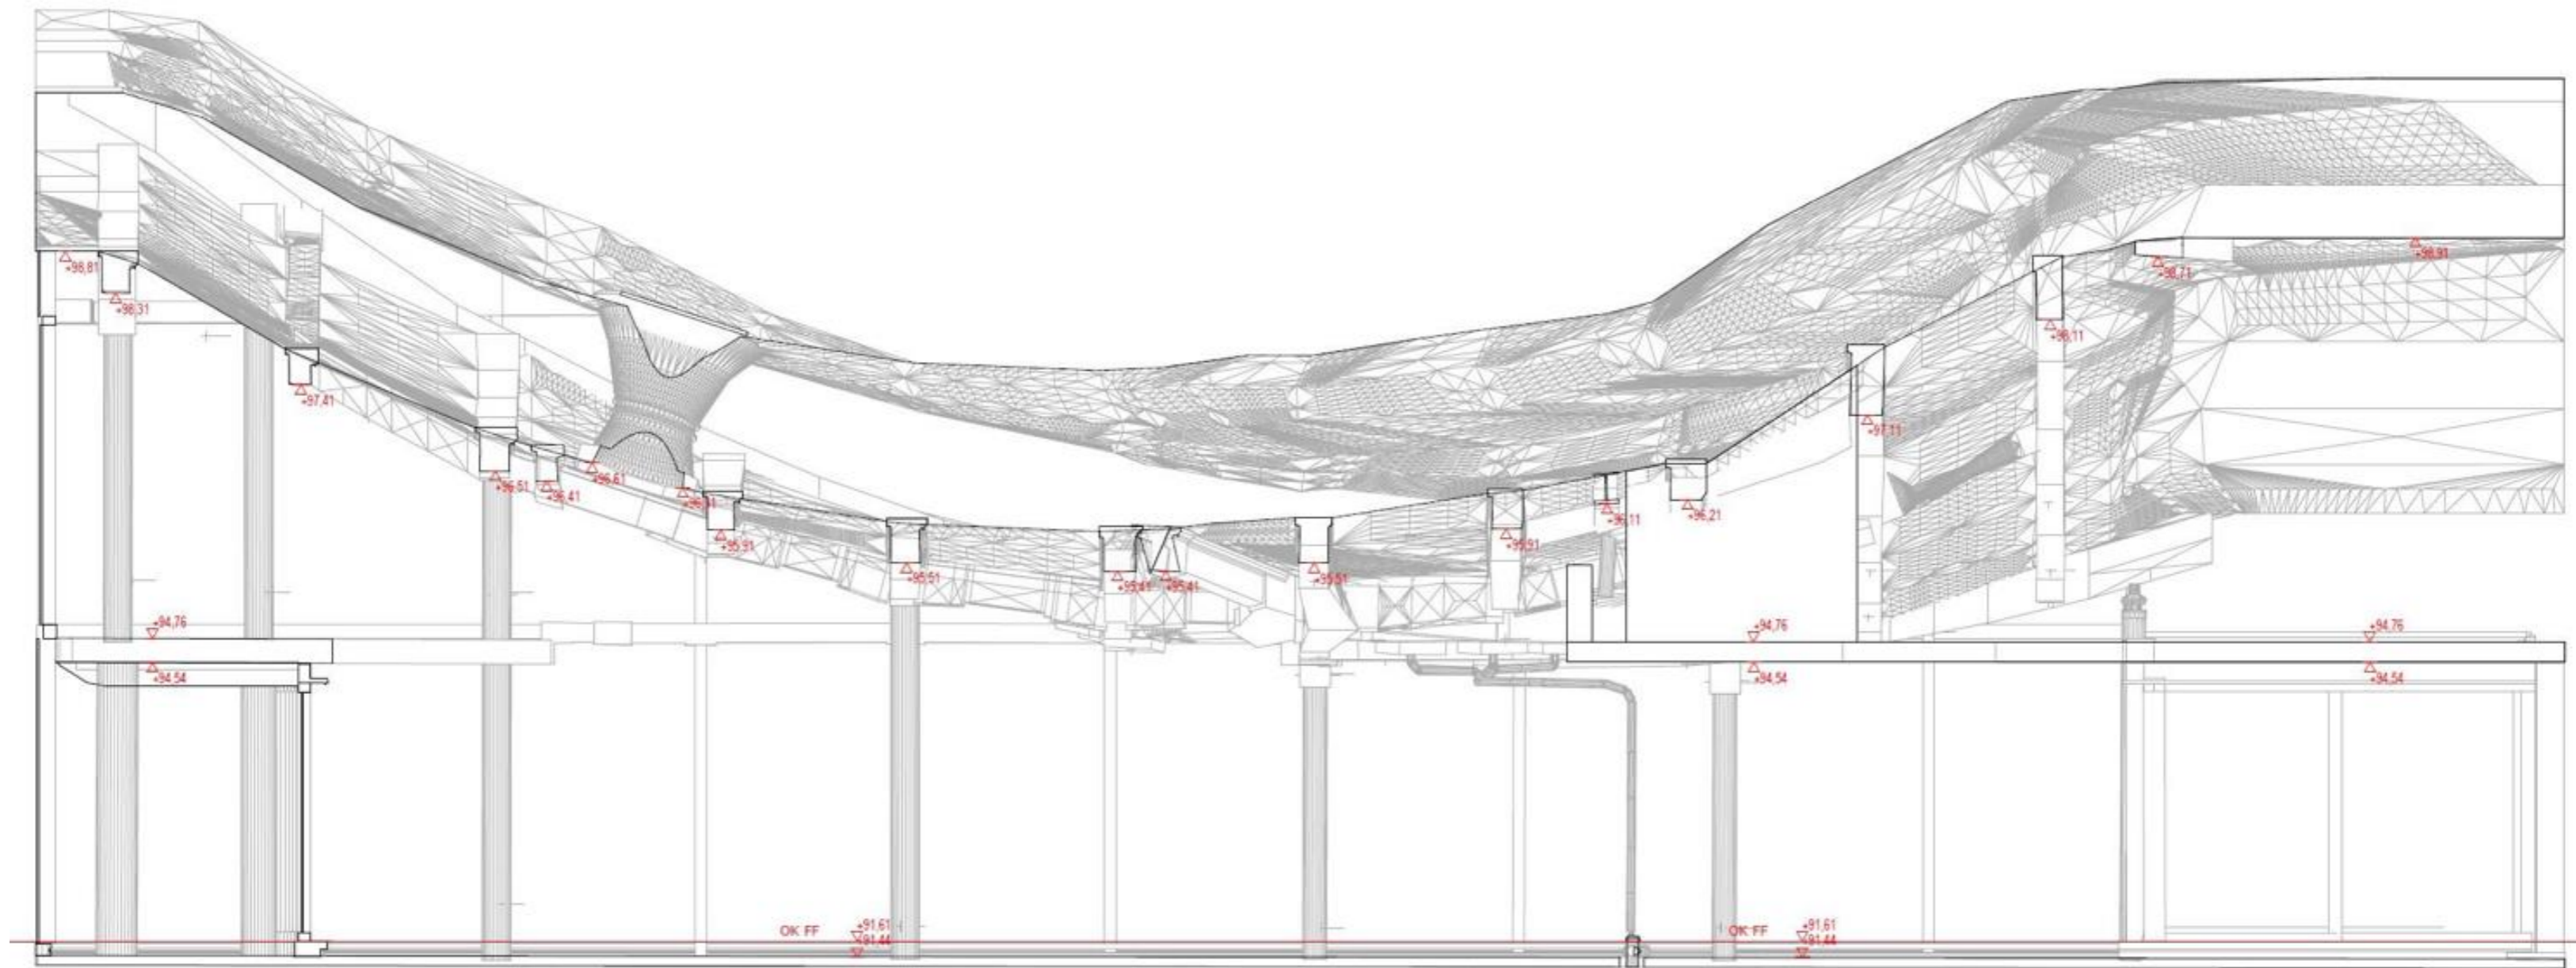


# Elbphilharmonie – TGA Planung

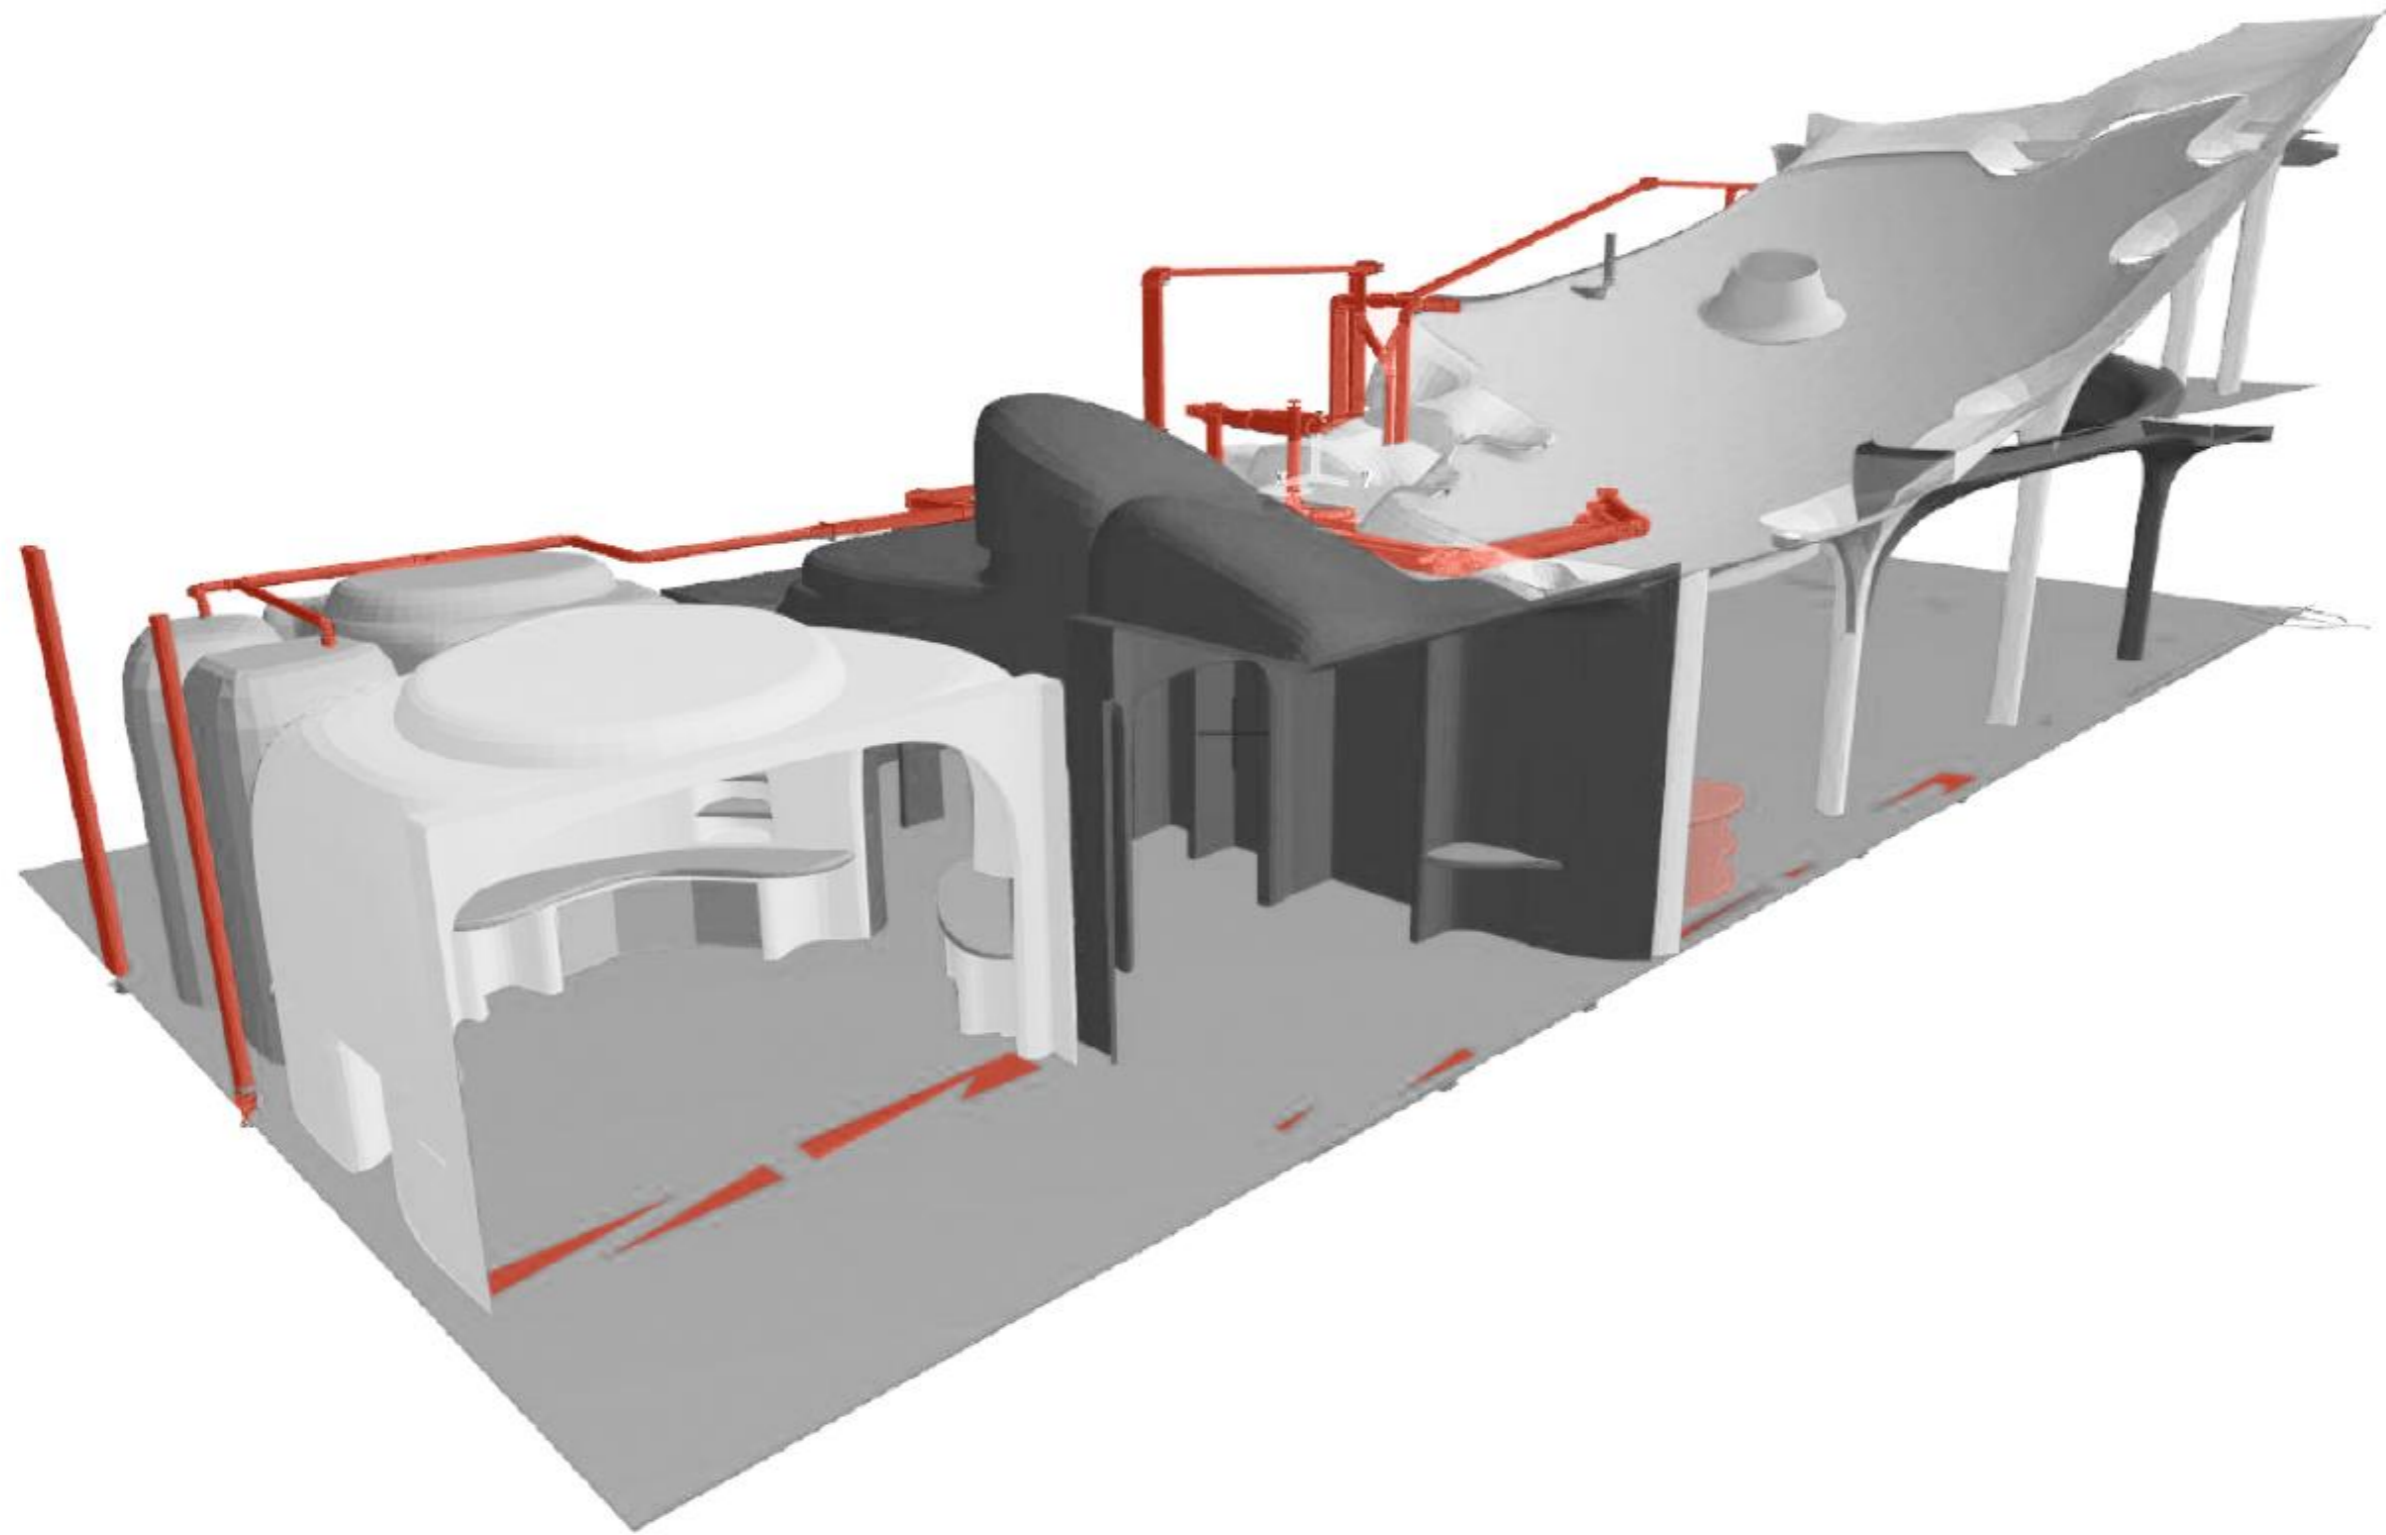

# Elbphilharmonie – vollständiges Modell

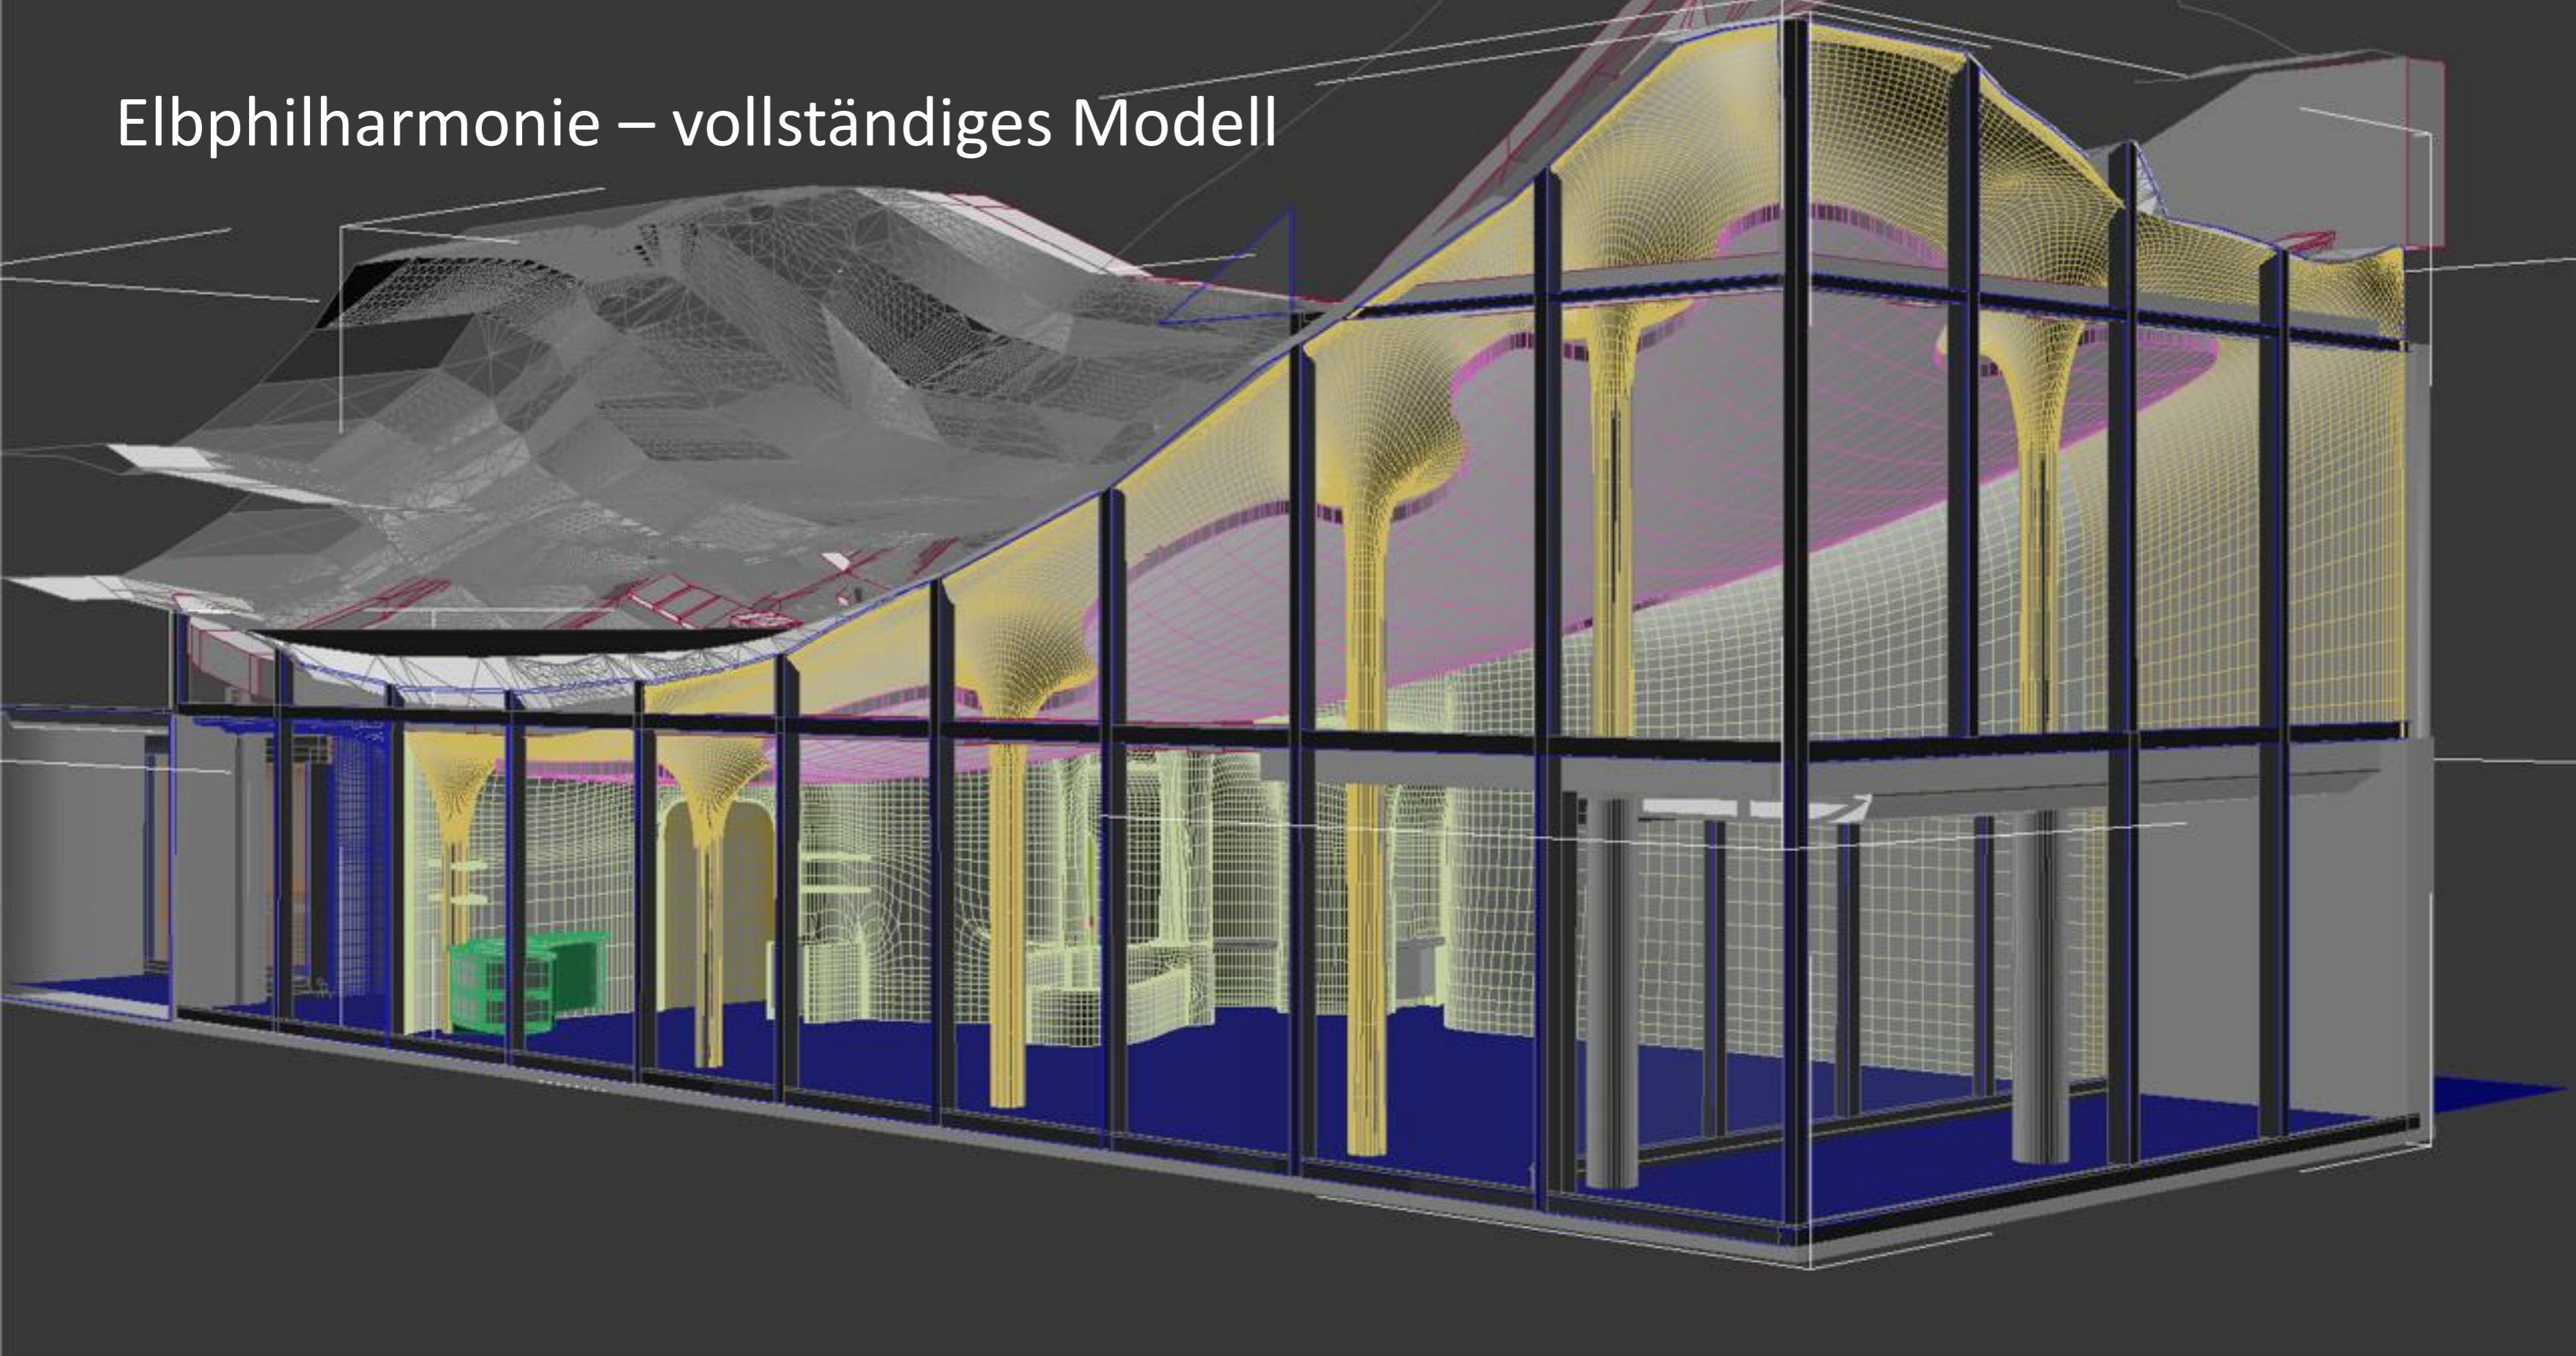

# Elbphilharmonie – Fertigung nach 3D Daten

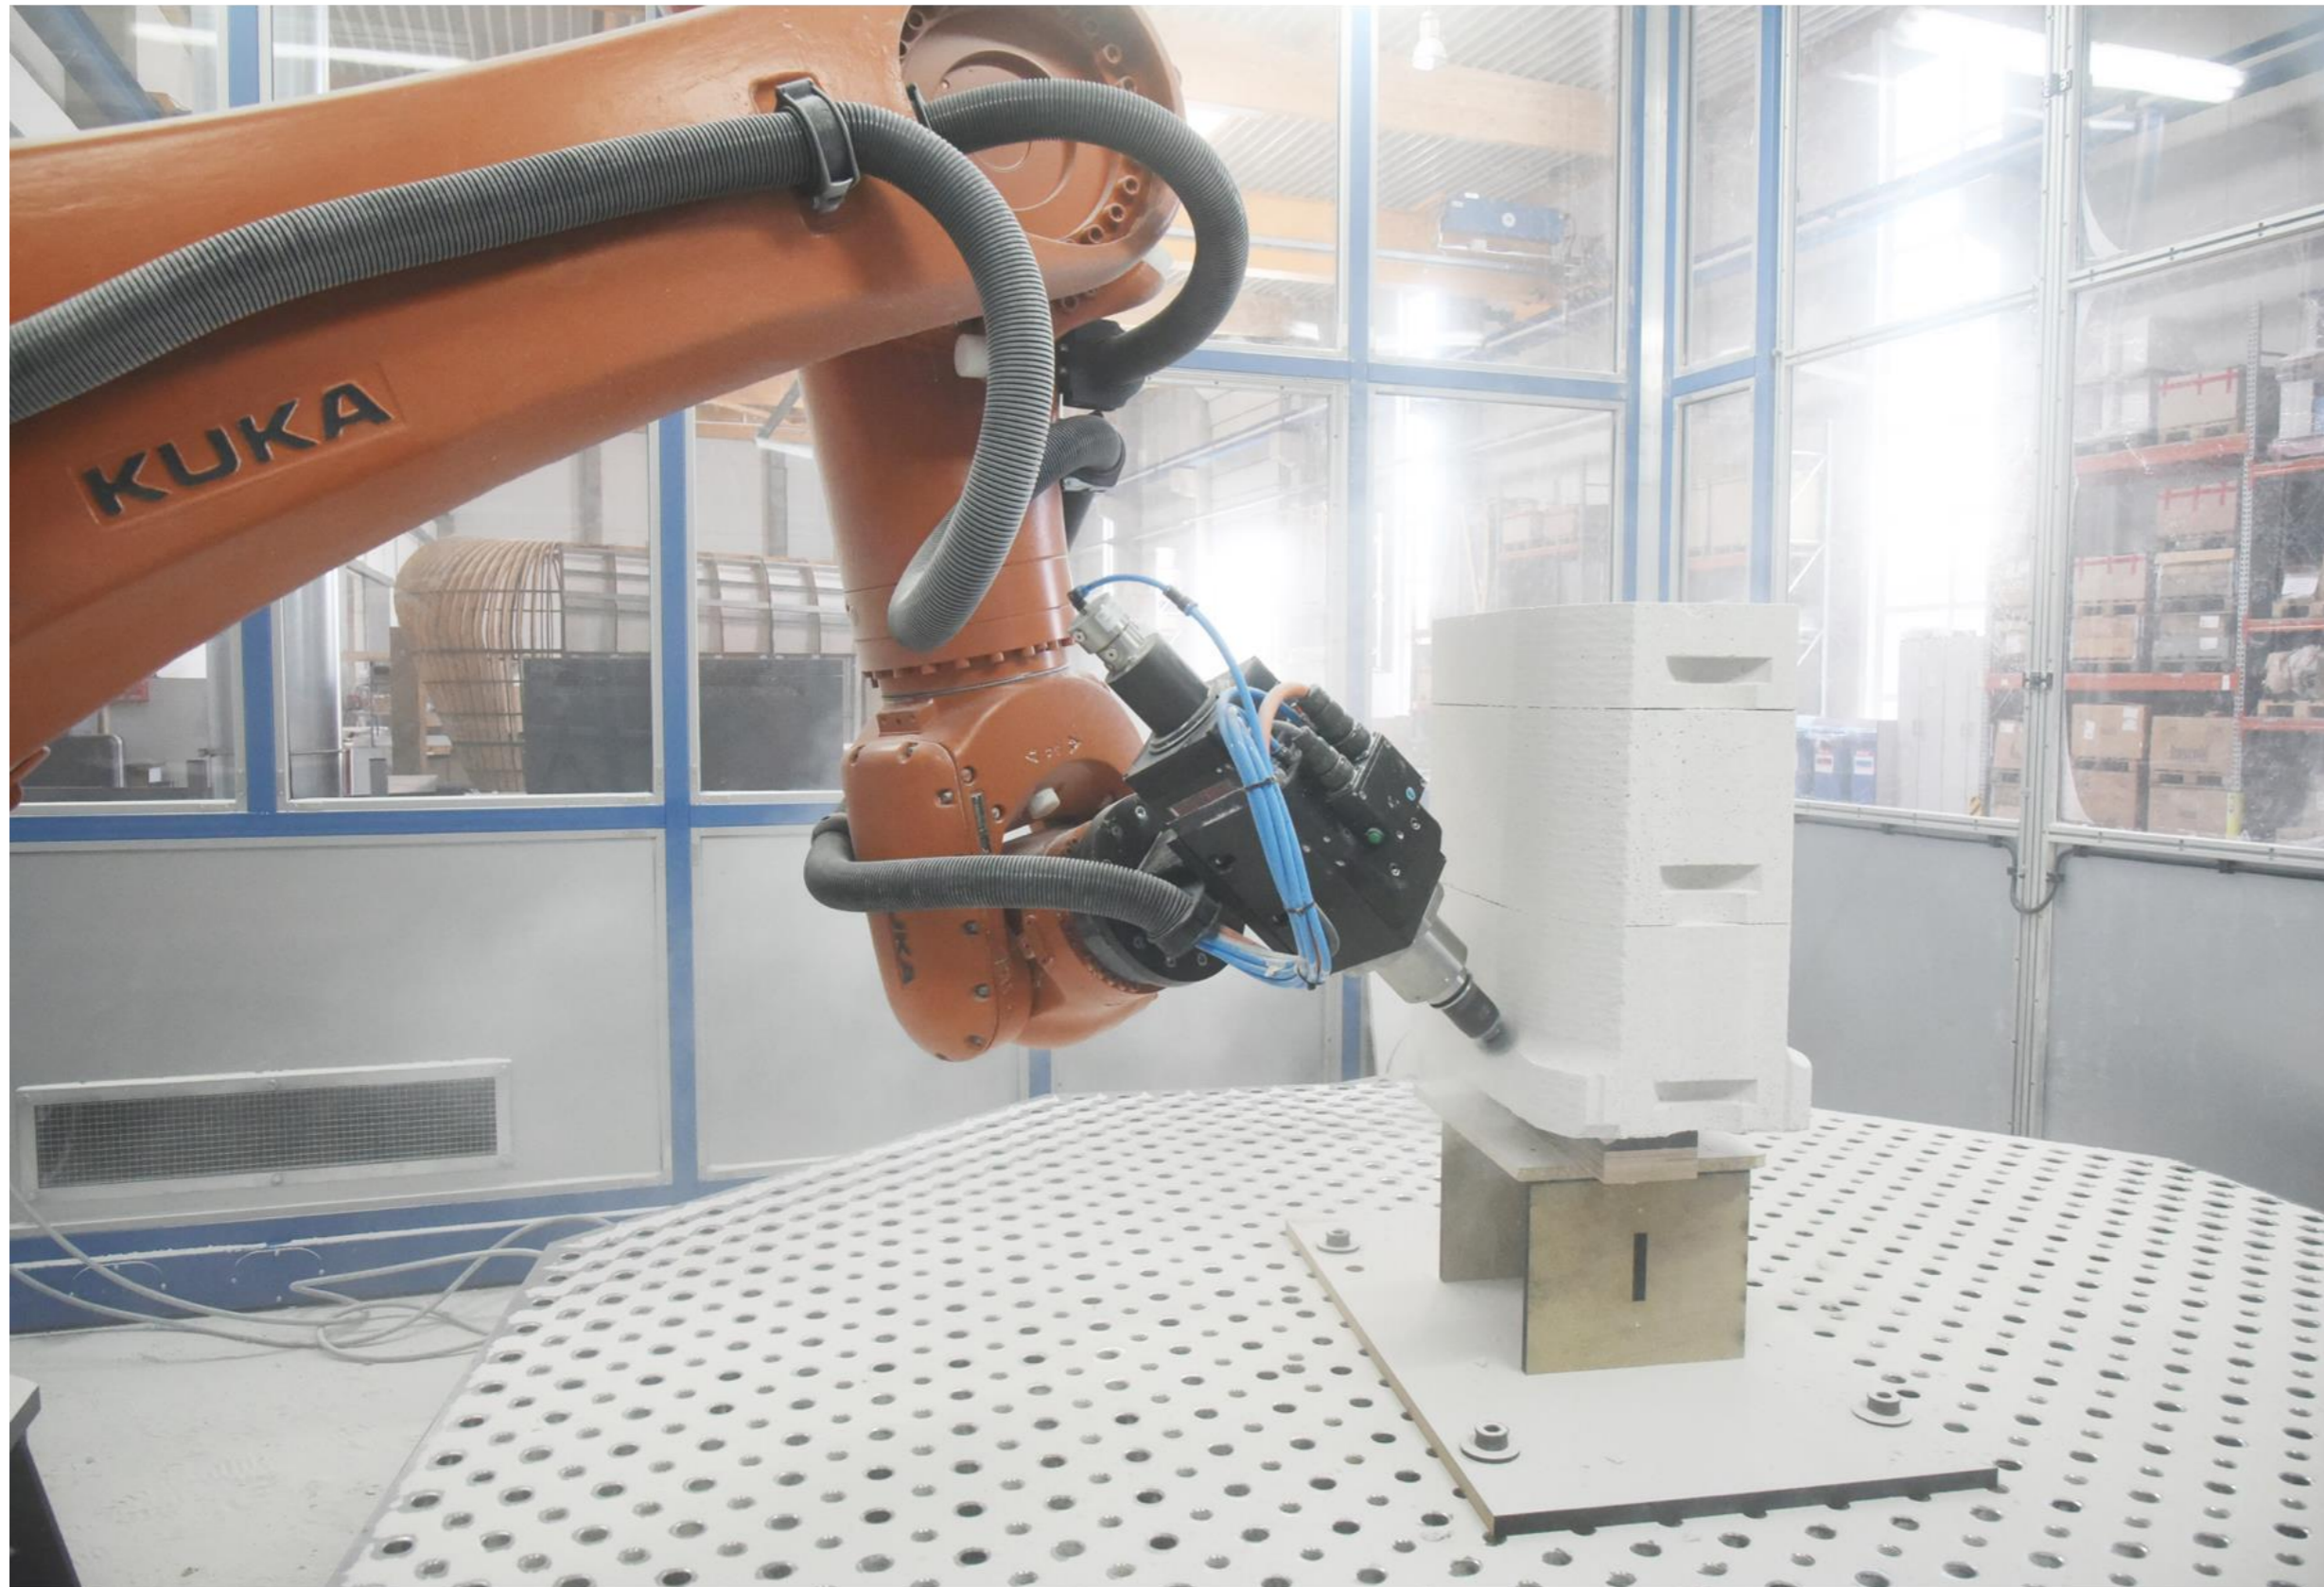

# Elbphilharmonie – Fertigung nach 3D Daten





# Elbphilharmonie – Bodenschablone




# Elbphilharmonie – Visualisierung




# Elbphilharmonie – Visualisierung



# InLoox PM – Start Mind Map

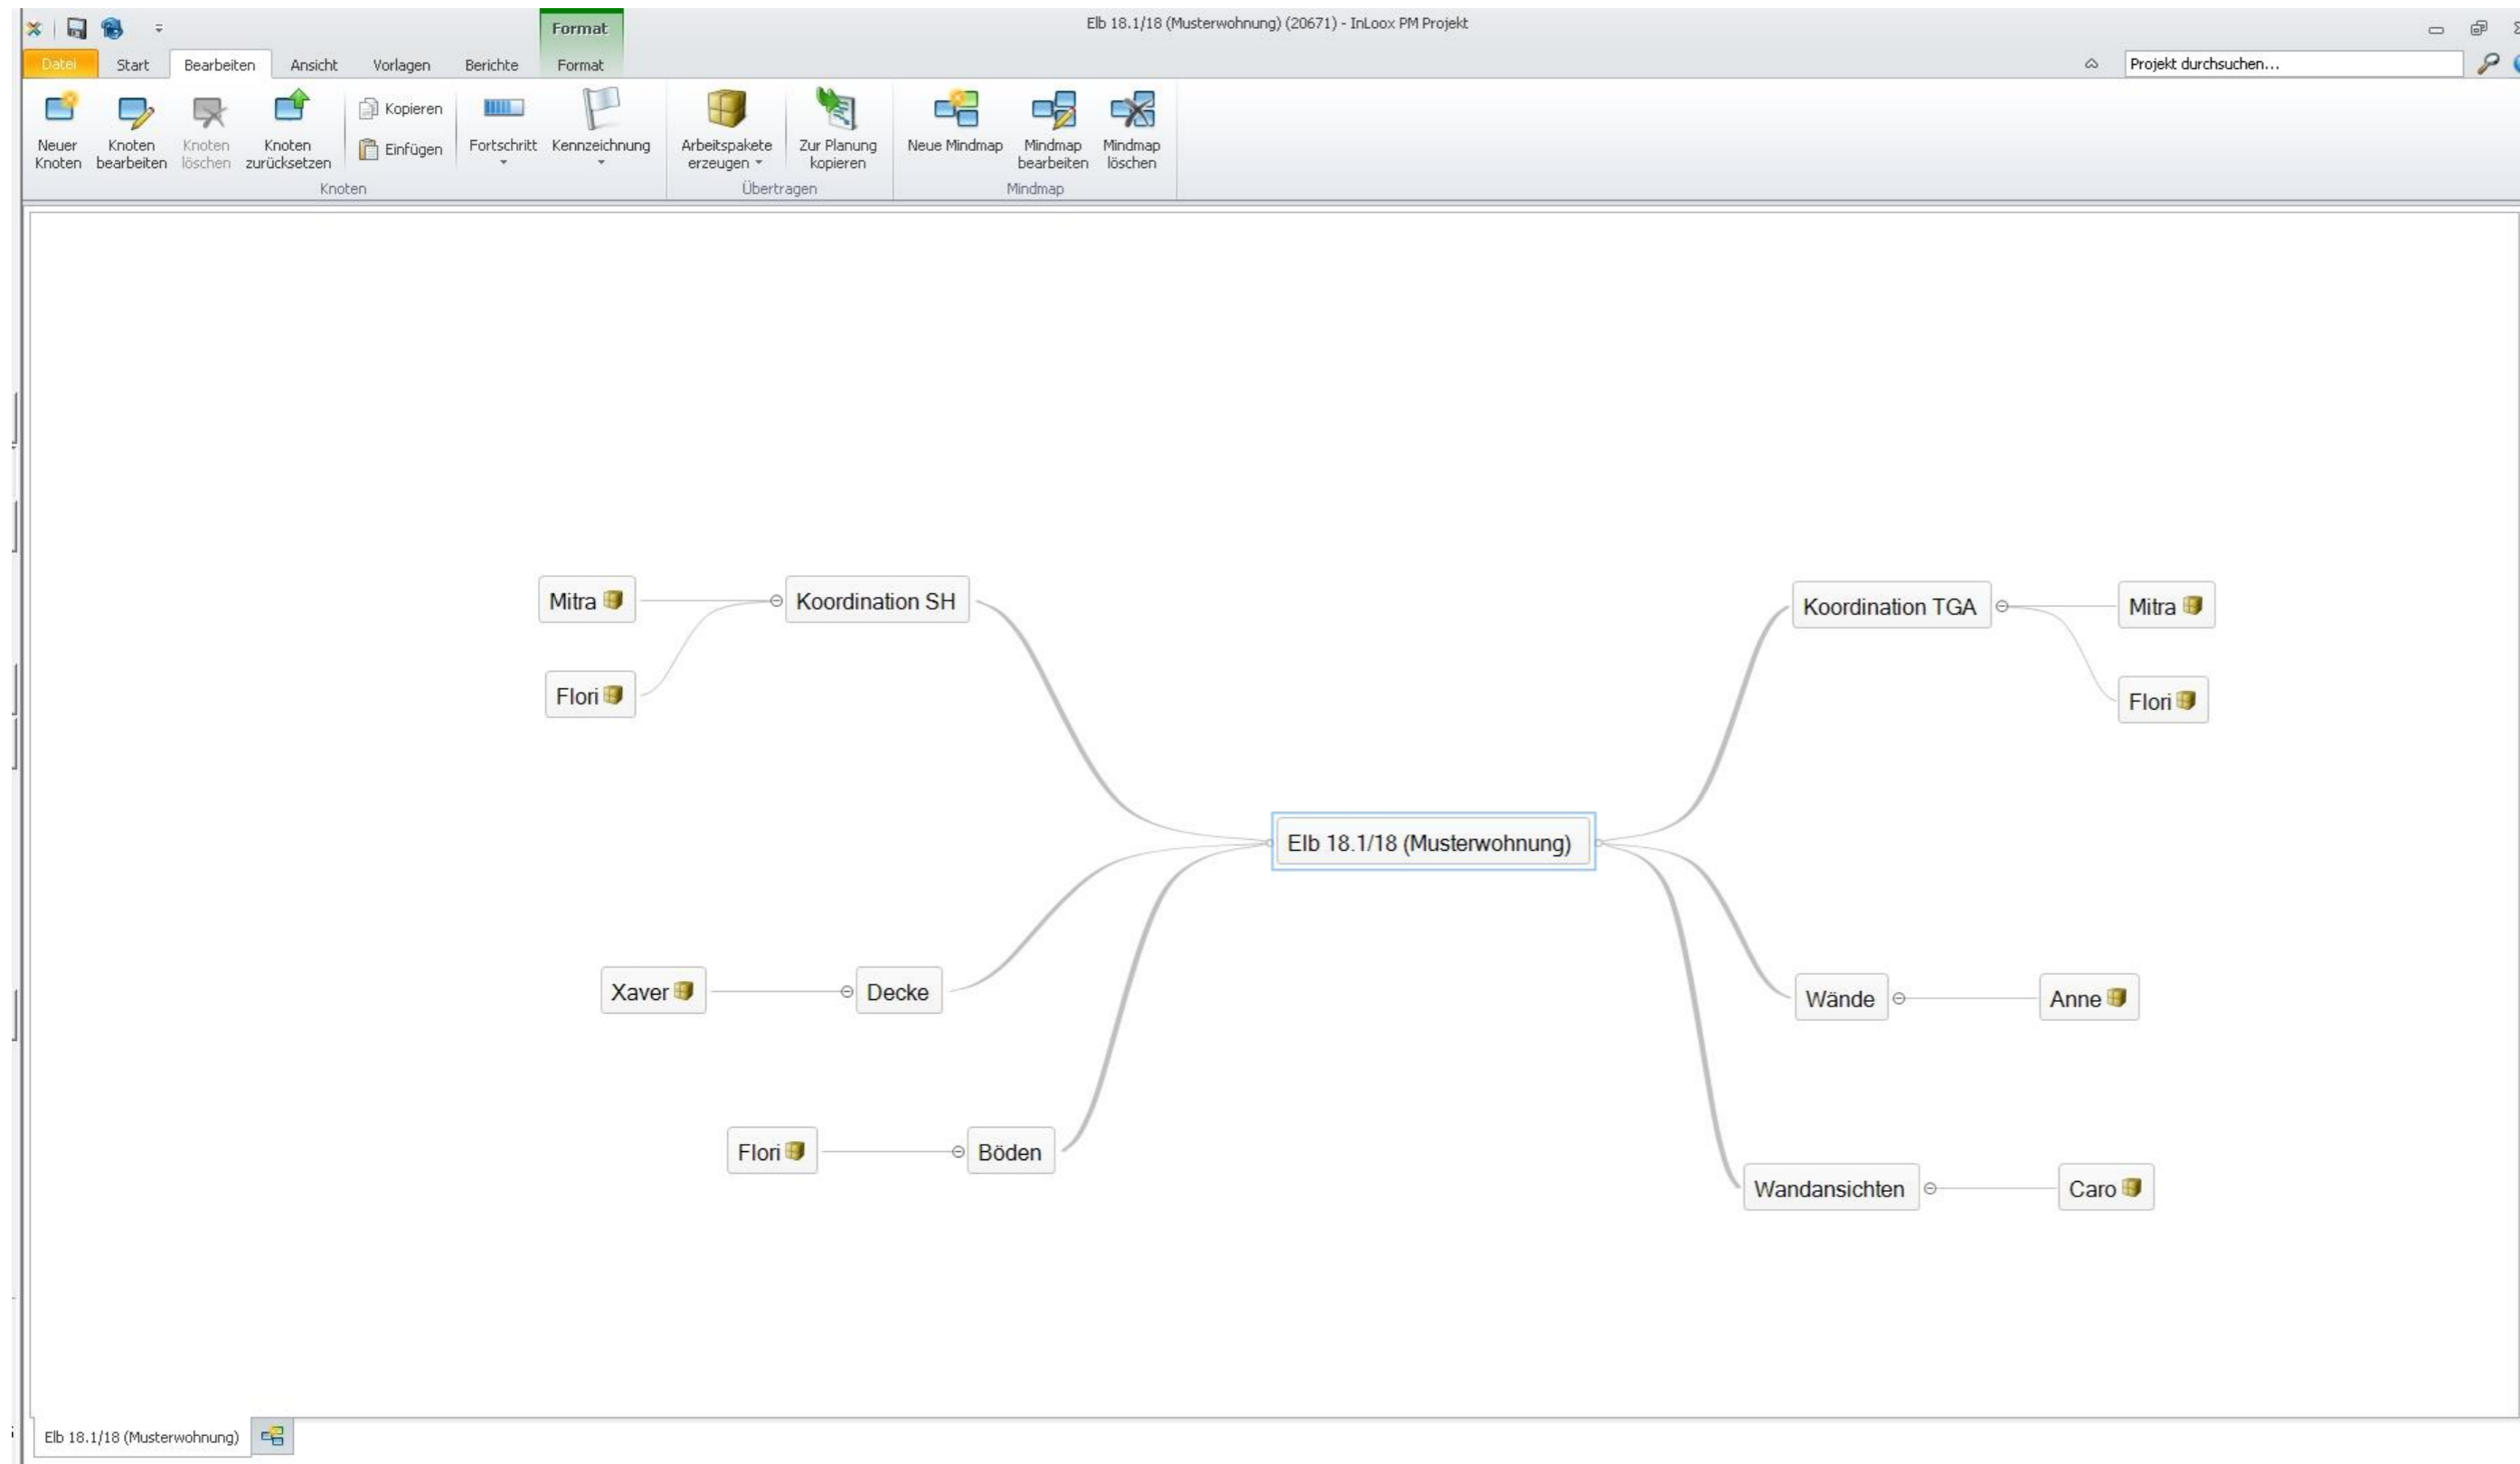

# InLoox PM – Beispiel Terminplanung

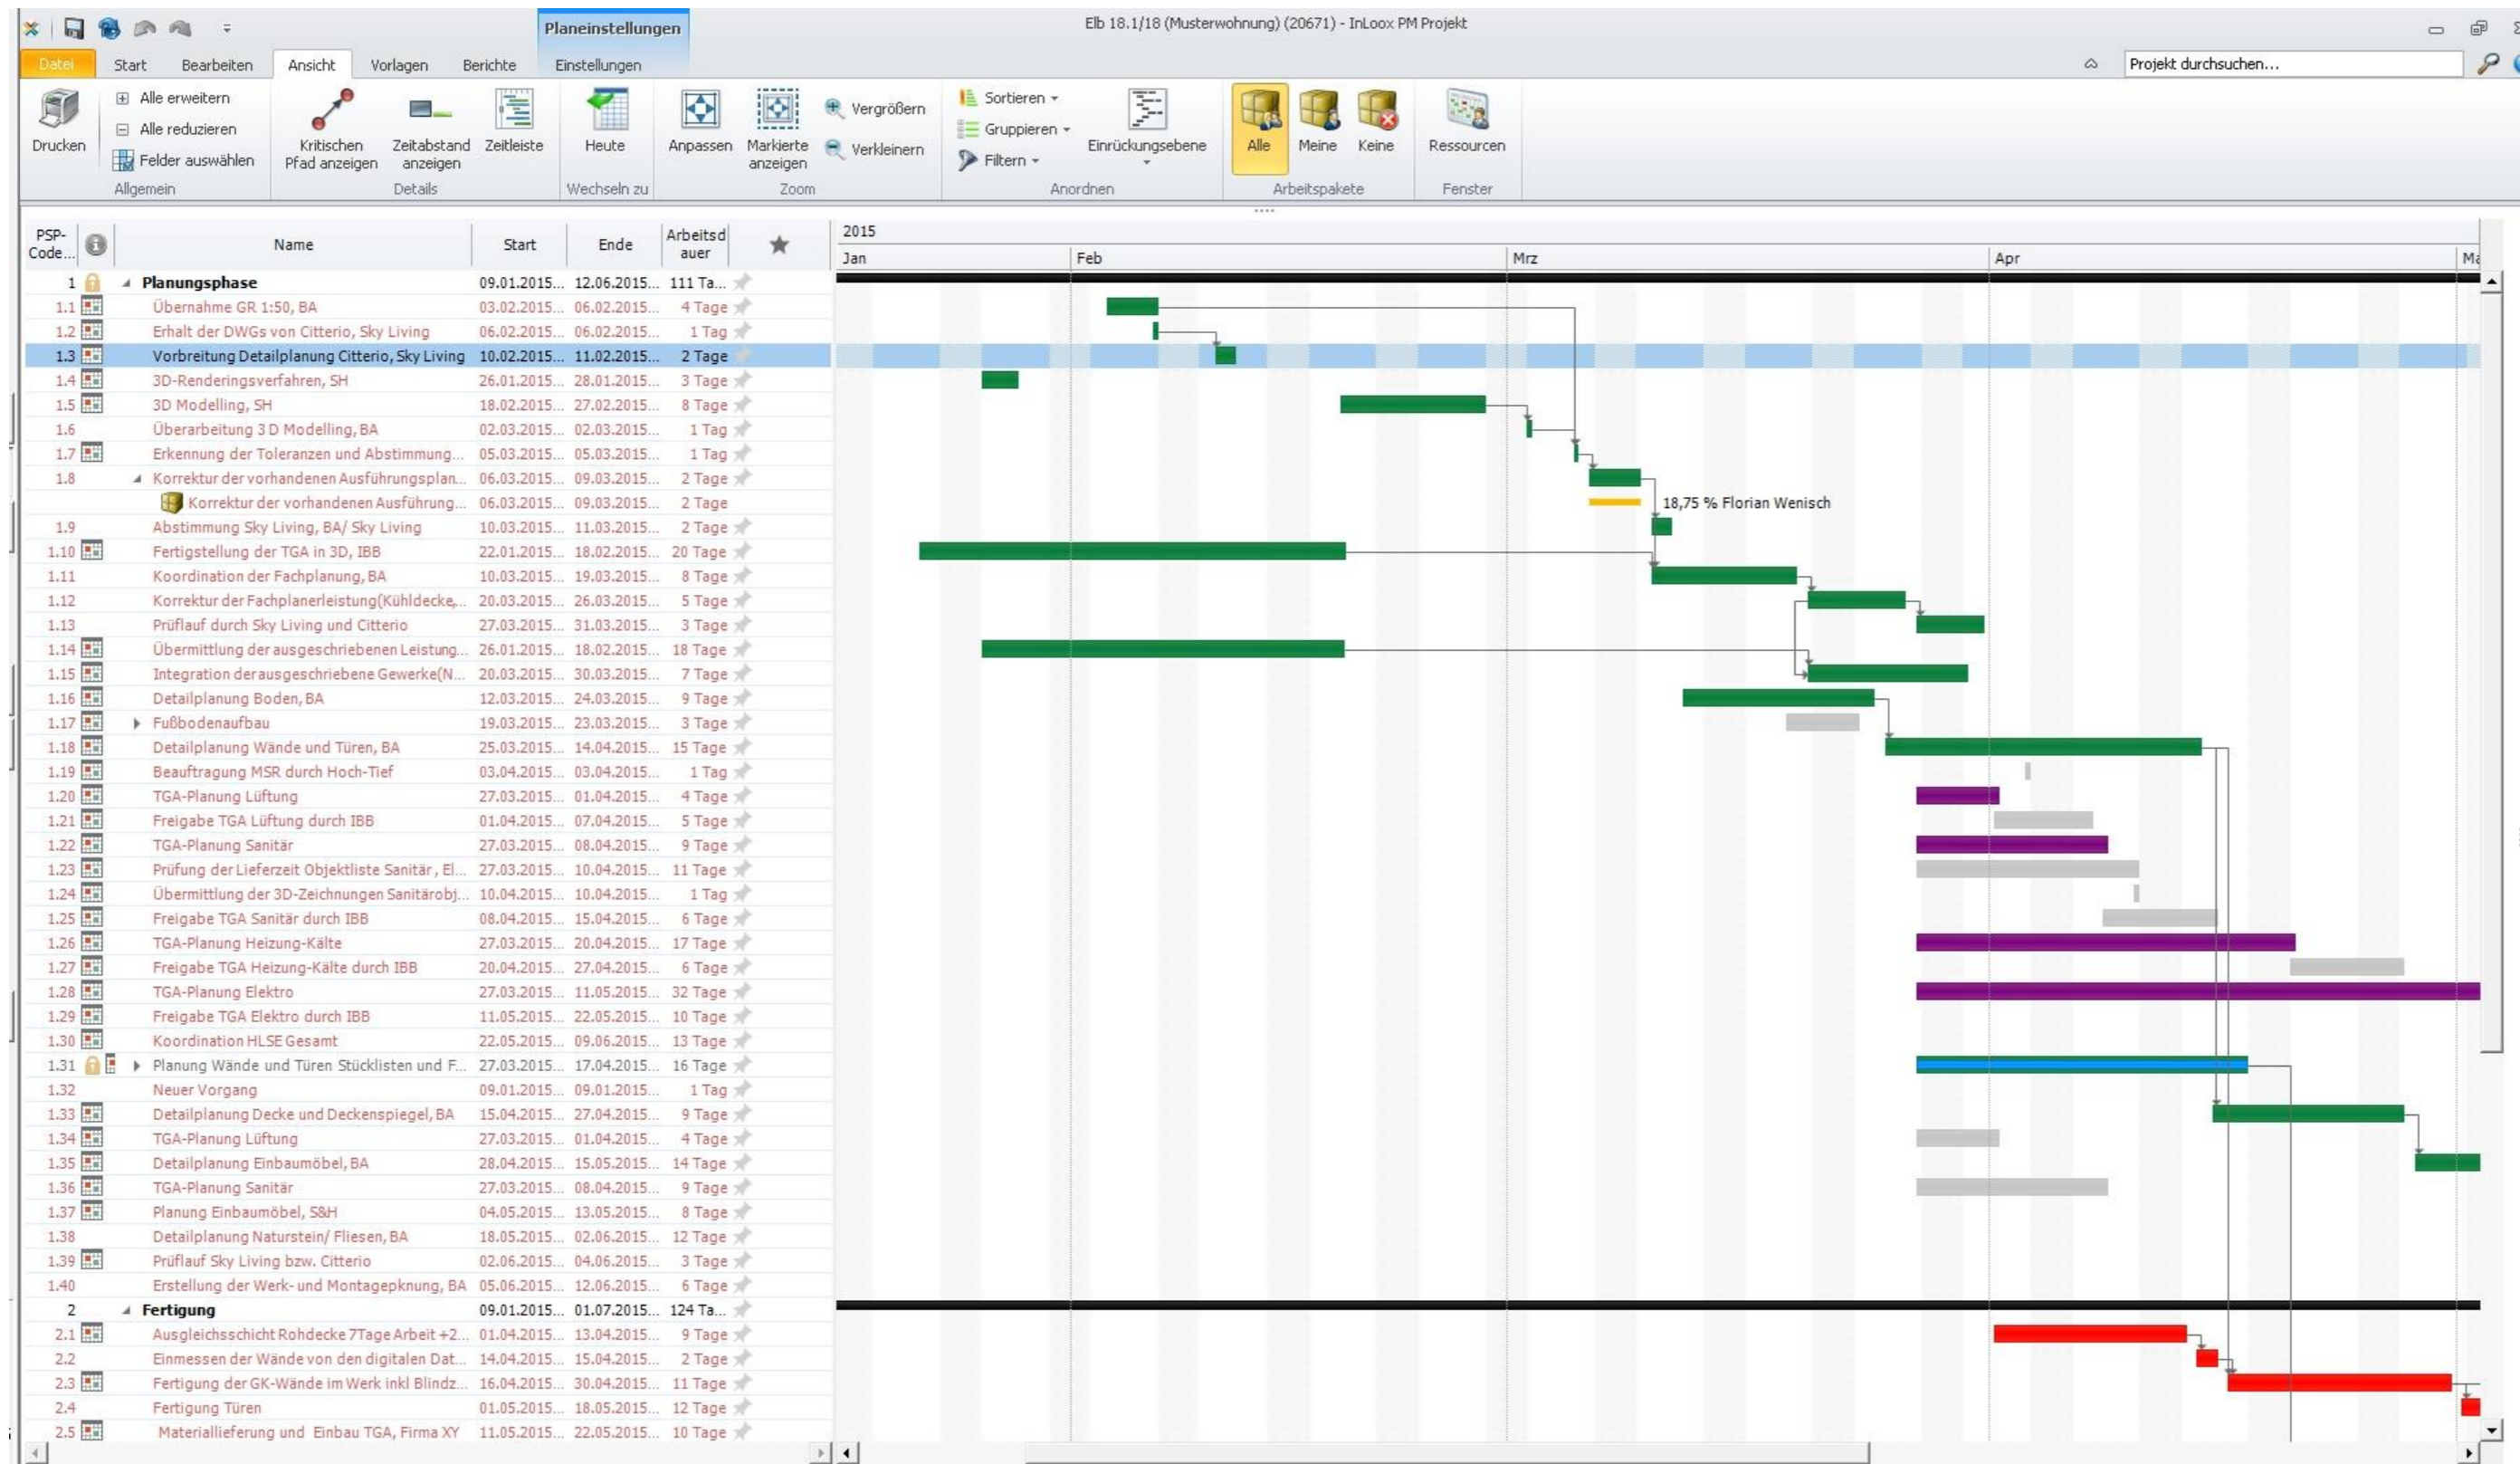

# InLoox PM – Beispiel Aufgaben

Elb 18.1/18 (Musterwohnung) (20671) - InLoox PM Projekt

Projekt durchsuchen...

Drucken Details anzeigen Filter Ressourcen

Allgemein Filter Fenster

Arbeitspakete filtern

Nicht begonnen	In Bearbeitung	Erledigt
Planung Boden, Stückliste, Planung Fräsung, S&H	Bodenaufbau	Nachhaken wegen Vertragsunterzeichnung
Detailplanung Wände und Türen, BA	Korrektur der vorhandenen Ausführungsplanung, BA	Carolin Köppel
Anne	Stückliste Wärmedämmung	Anpassung und Korrektur der Wände
Xaver	Stückliste Trittschalldämmung	Planung Wände und Türen Stücklisten und Fräsungen, ...
Flori	Koordination HLSE	Wandansichten Sanitärkern 1
Mitra	Deckenspiegel einzeichnen	
Flori	Einbaumöbel	
Mitra	Erstellung Angebots- LV	
Flori		

Abteilungen und Teams

- Brückner
  - Brückner Architekten GmbH
  - Brückner GP GmbH
  - Brückner Innenarchitekten
- Team hinzufügen
- Neues Team
  - Laurent Brueckner
  - Sigrid Mocosch
  - Stefanie Dürr
  - Susanne Brückner
  - Walter Hipp

Sie haben 14 entgangene Anrufe  
Sie haben 934 neue E-Mails

# InLoox PM – Beispiel Aufgaben

**Allgemein**

Name: OG 1 H 70 % Deckenspiegel M 1:50

Beschreibung: Checkliste WP 1

Aufwand: 16 Stunden

Ressource: Florian Wenisch

Start: 21.04.2016 08:30 (aus Vorgang)

Ende: 28.04.2016 08:30 (aus Vorgang)

**Dokumente**

[Neue Verknüpfung...](#)

**Budget**

Gruppe: Planung

Abrechenbar


Individuell

**Benachrichtigungen**

**Eigene Felder**

Priorität: 2

# Google Headquarter – PM auf hohem Niveau

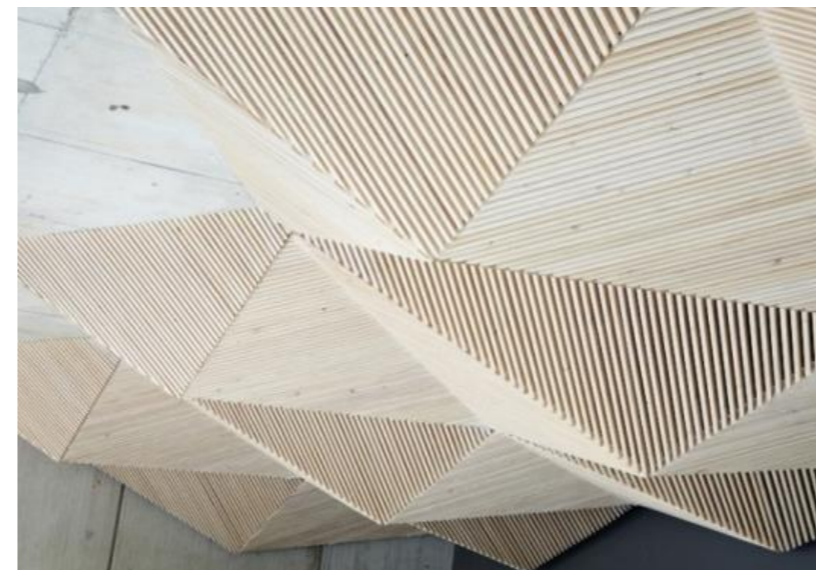



# Google Headquarter – PM auf hohem Niveau




OPEN SPACE – THEMENWELTEN

EISBACH

Surf'n ride


O'bach Nackerte

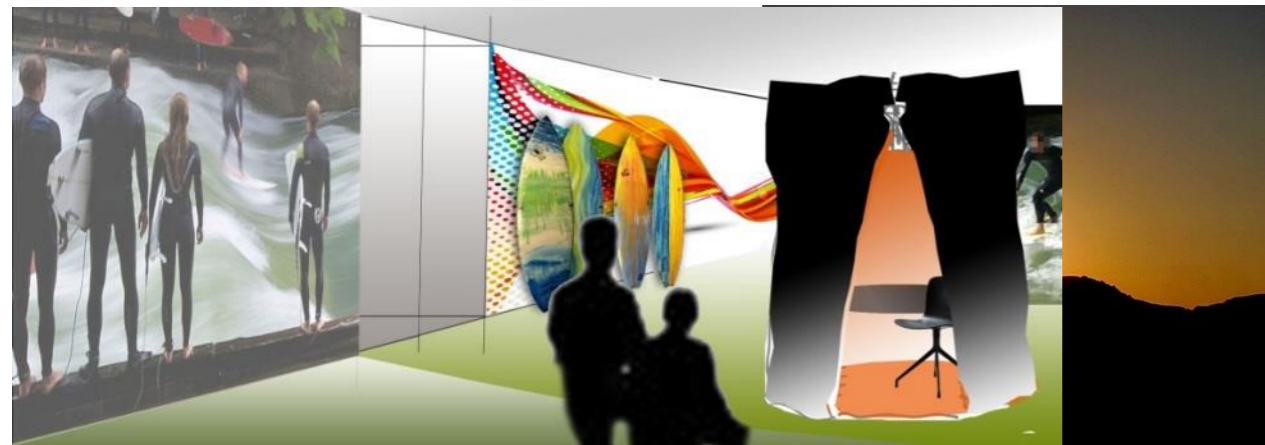


# InLoox PM – Beispiel Ausführungsplanung



# InLoox PM – Beispiel Ausführungsplanung Detail

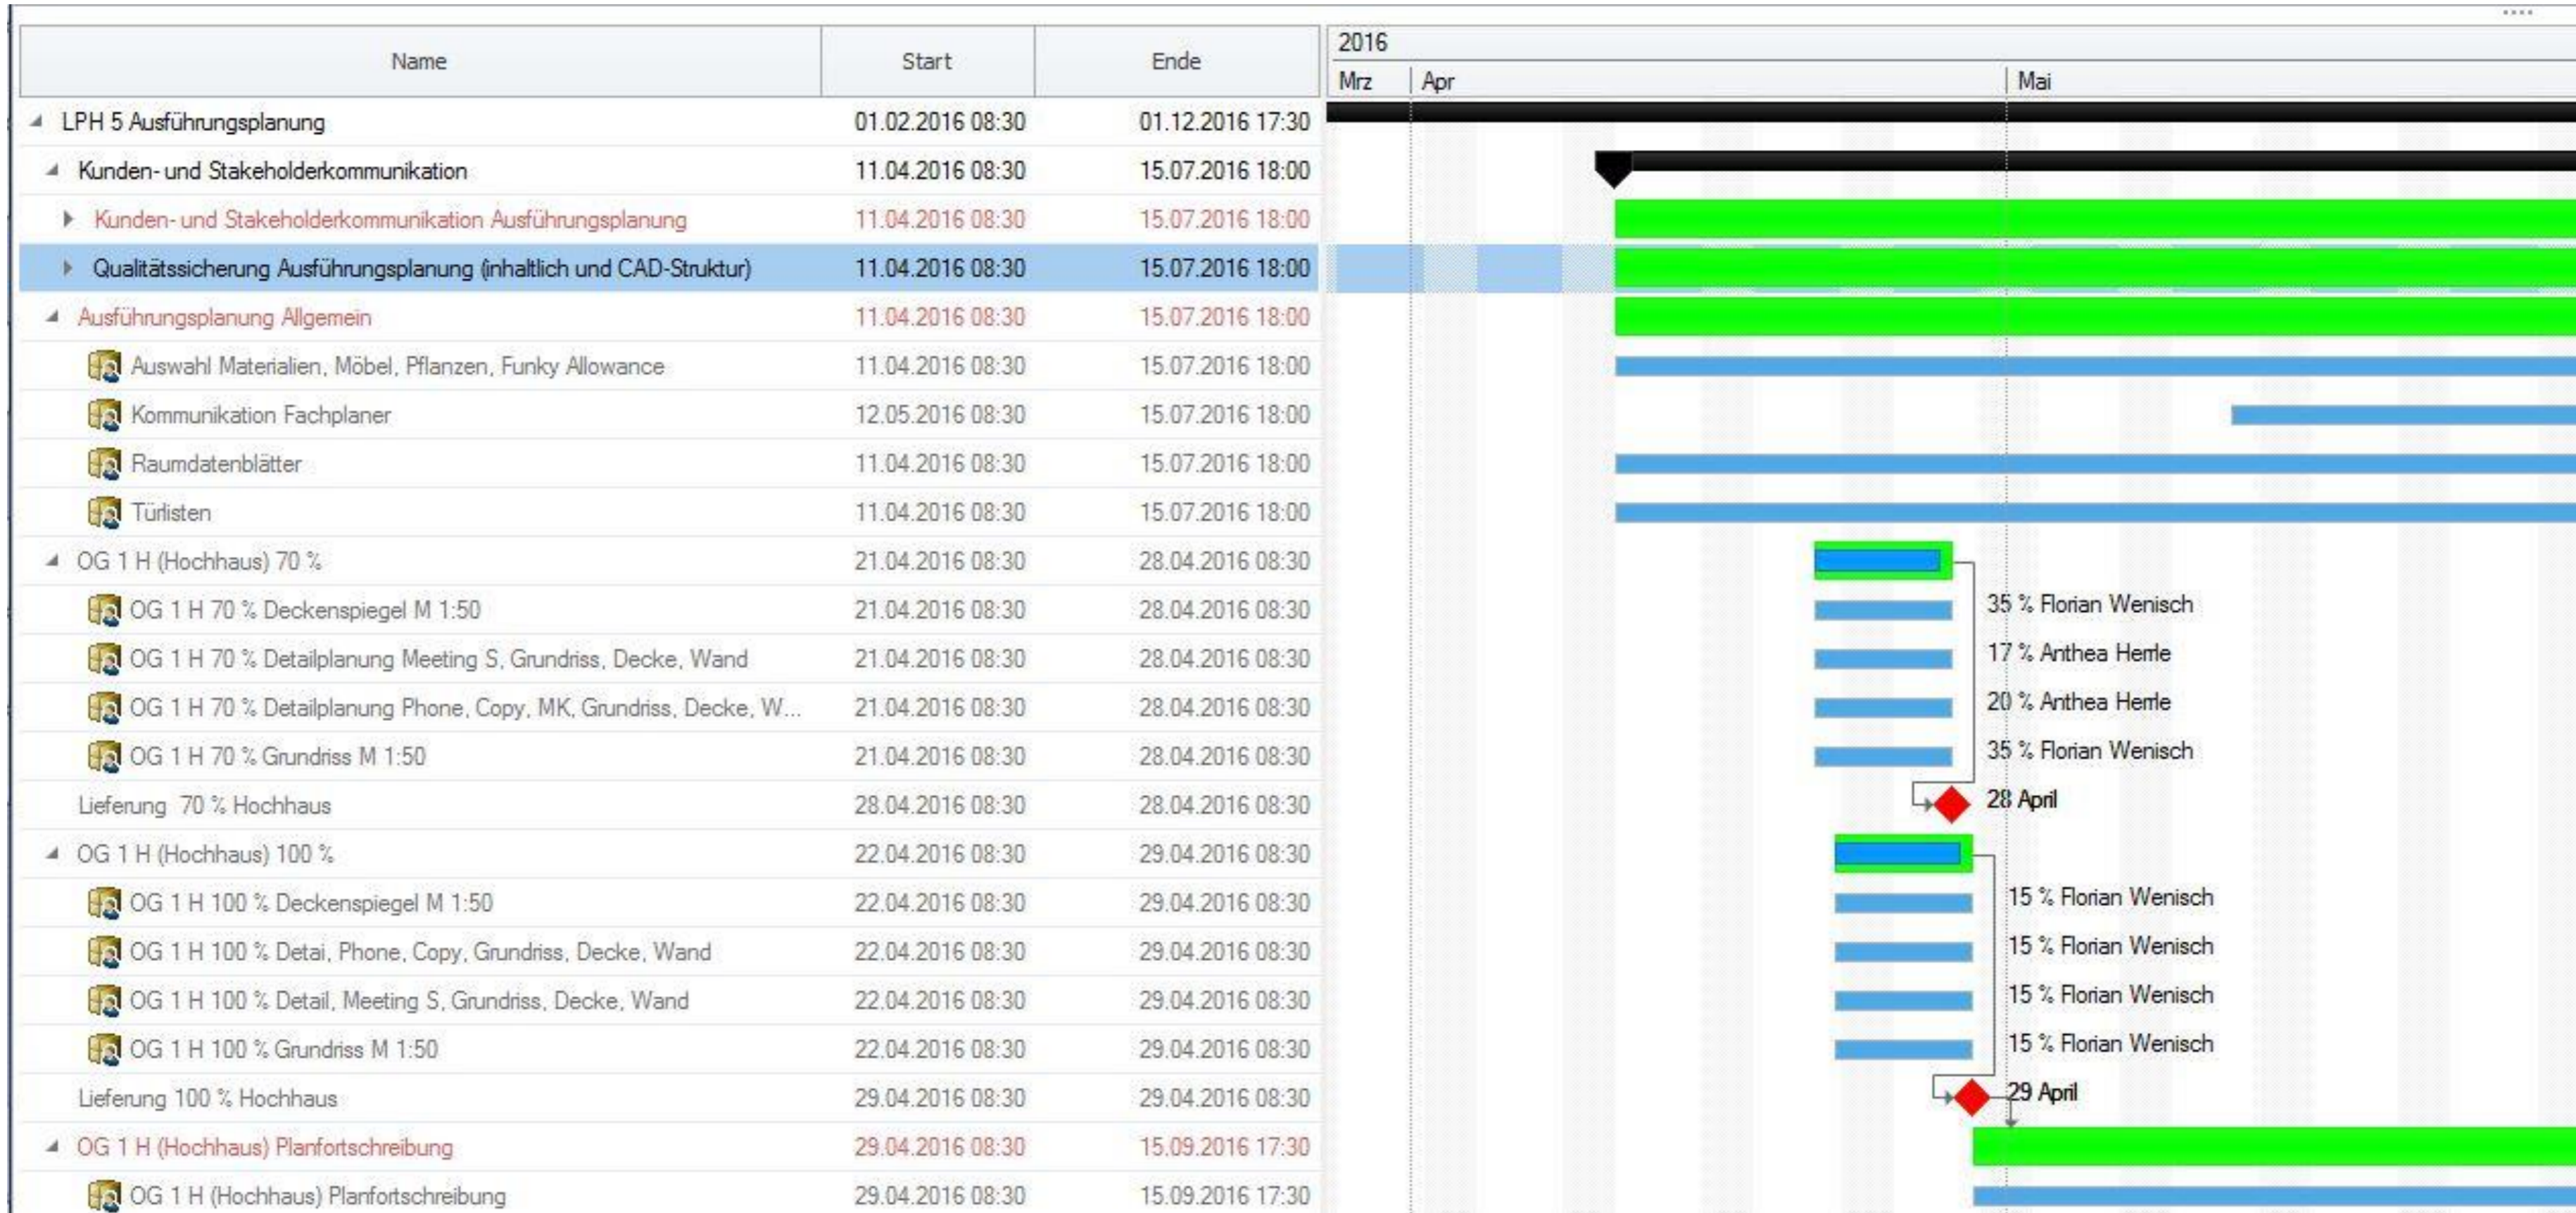

# InLoox PM – Beispiel Micromanagement

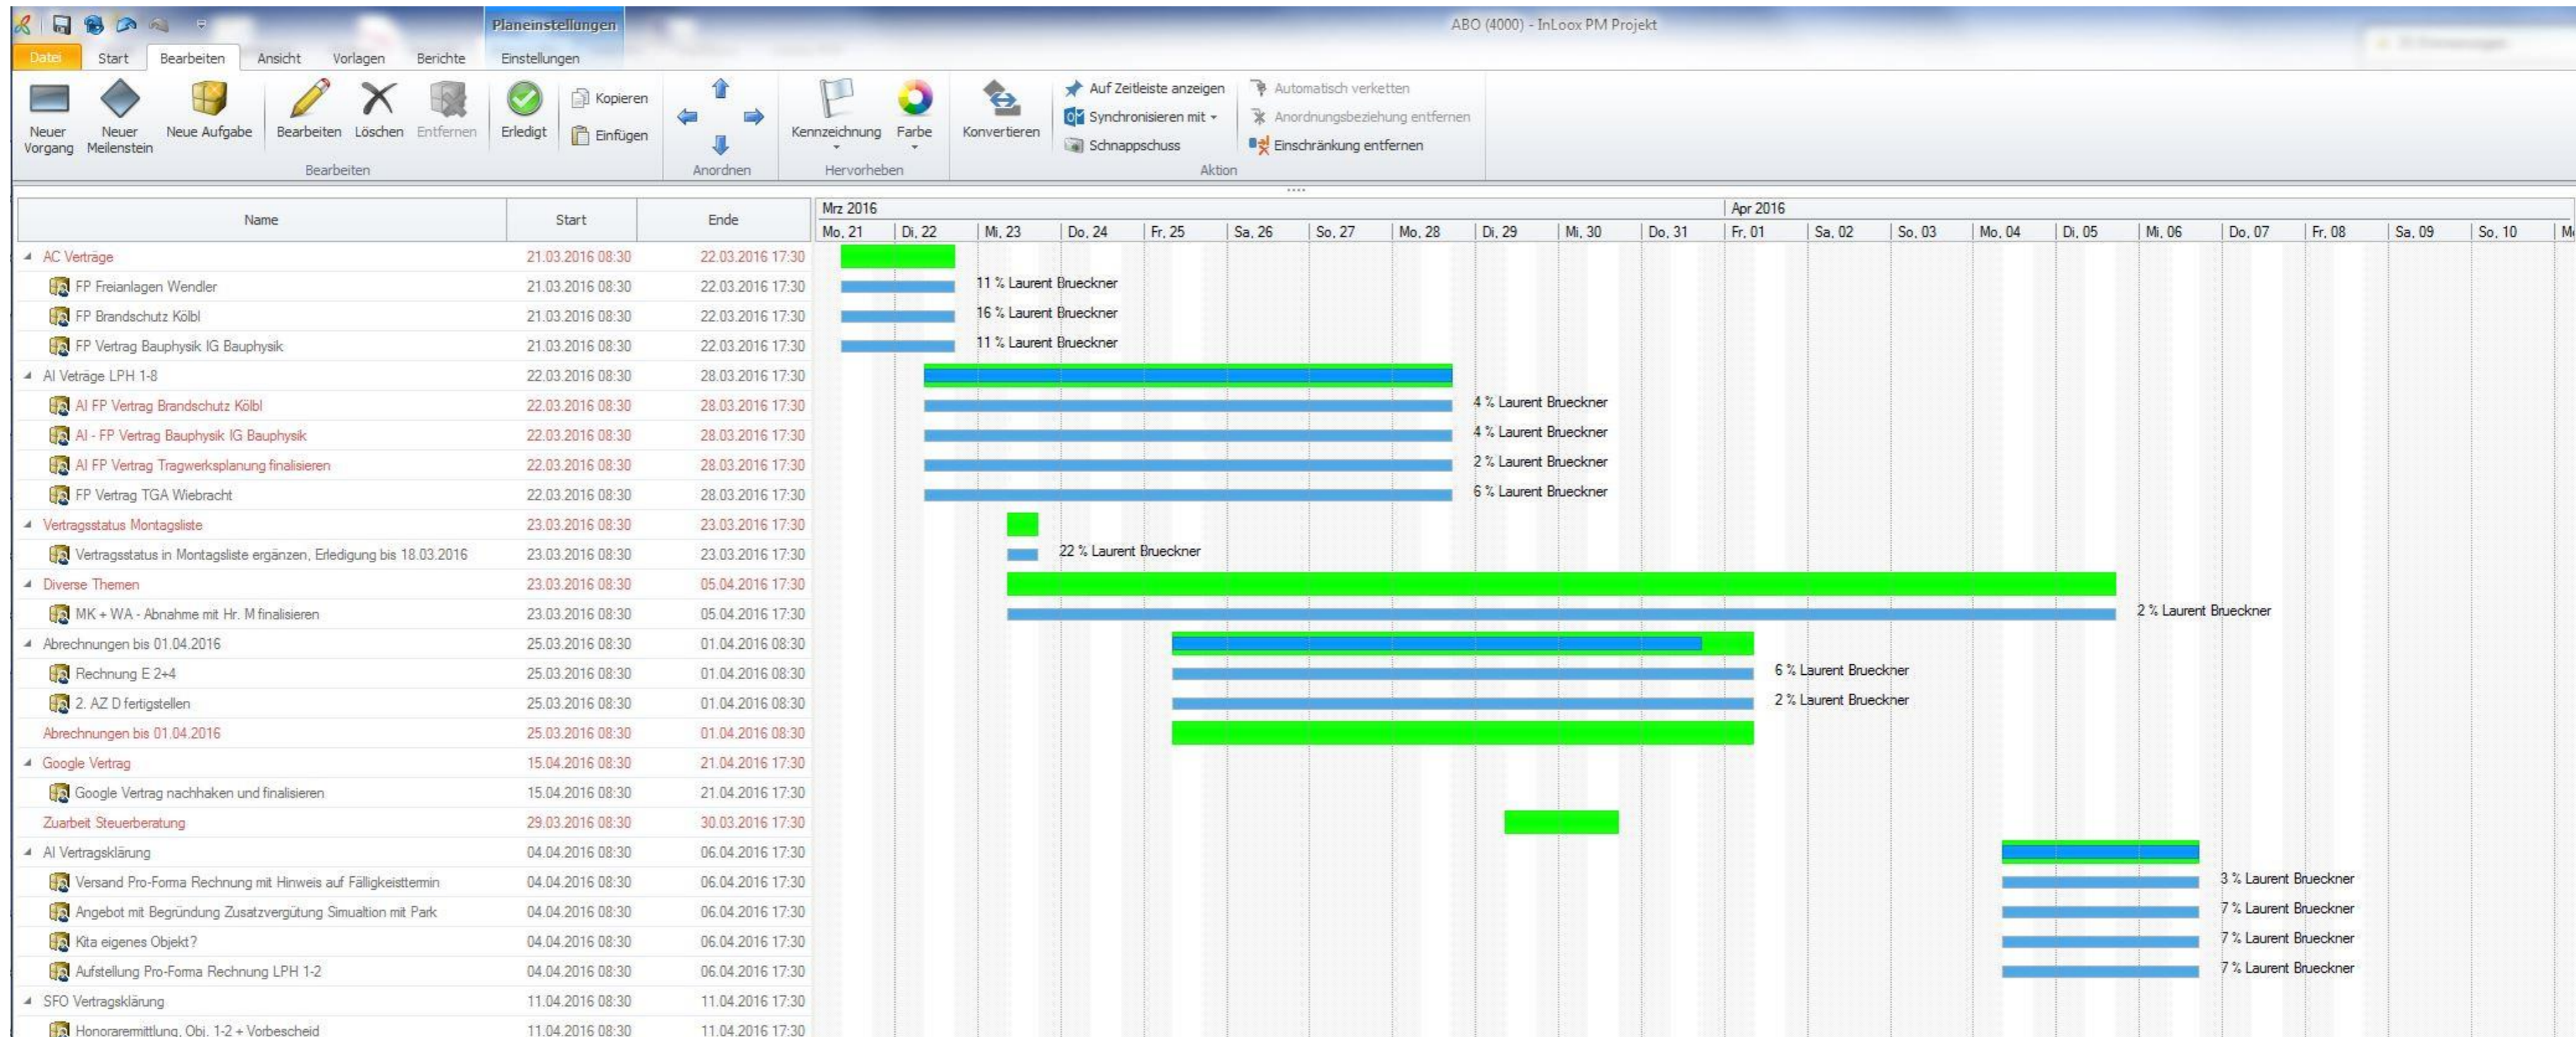

# InLoox PM – Beispiel Zeiterfassung

Eintrag bearbeiten

**Datum und Dauer**

Start ▼ 18.06.2015 09:27 ▼

Dauer ▼ 01:00 ▼

Beschreibung

Wände in Detailplanung integriert.

**Zuordnung**

Arbeitspaket ▼ Detailplanung Wände und Türen, BA ▼

Gruppe Beratung ▼

**Details**

Kennzeichnung Keine ▼

Ausgeführt von Laurent Brueckner ▼

Abrechenbar

**Dokumente**

Neue Verknüpfung...

OK Abbrechen

# InLoox PM – Beispiel Akquisition

dynamic line | flow



directness | transparency | significance




german values | hightech & engineering  
history | tradition | made in germany



# InLoox PM – Präsentation Erstgespräch

Medizintechnik (20811)

Walter Hipp

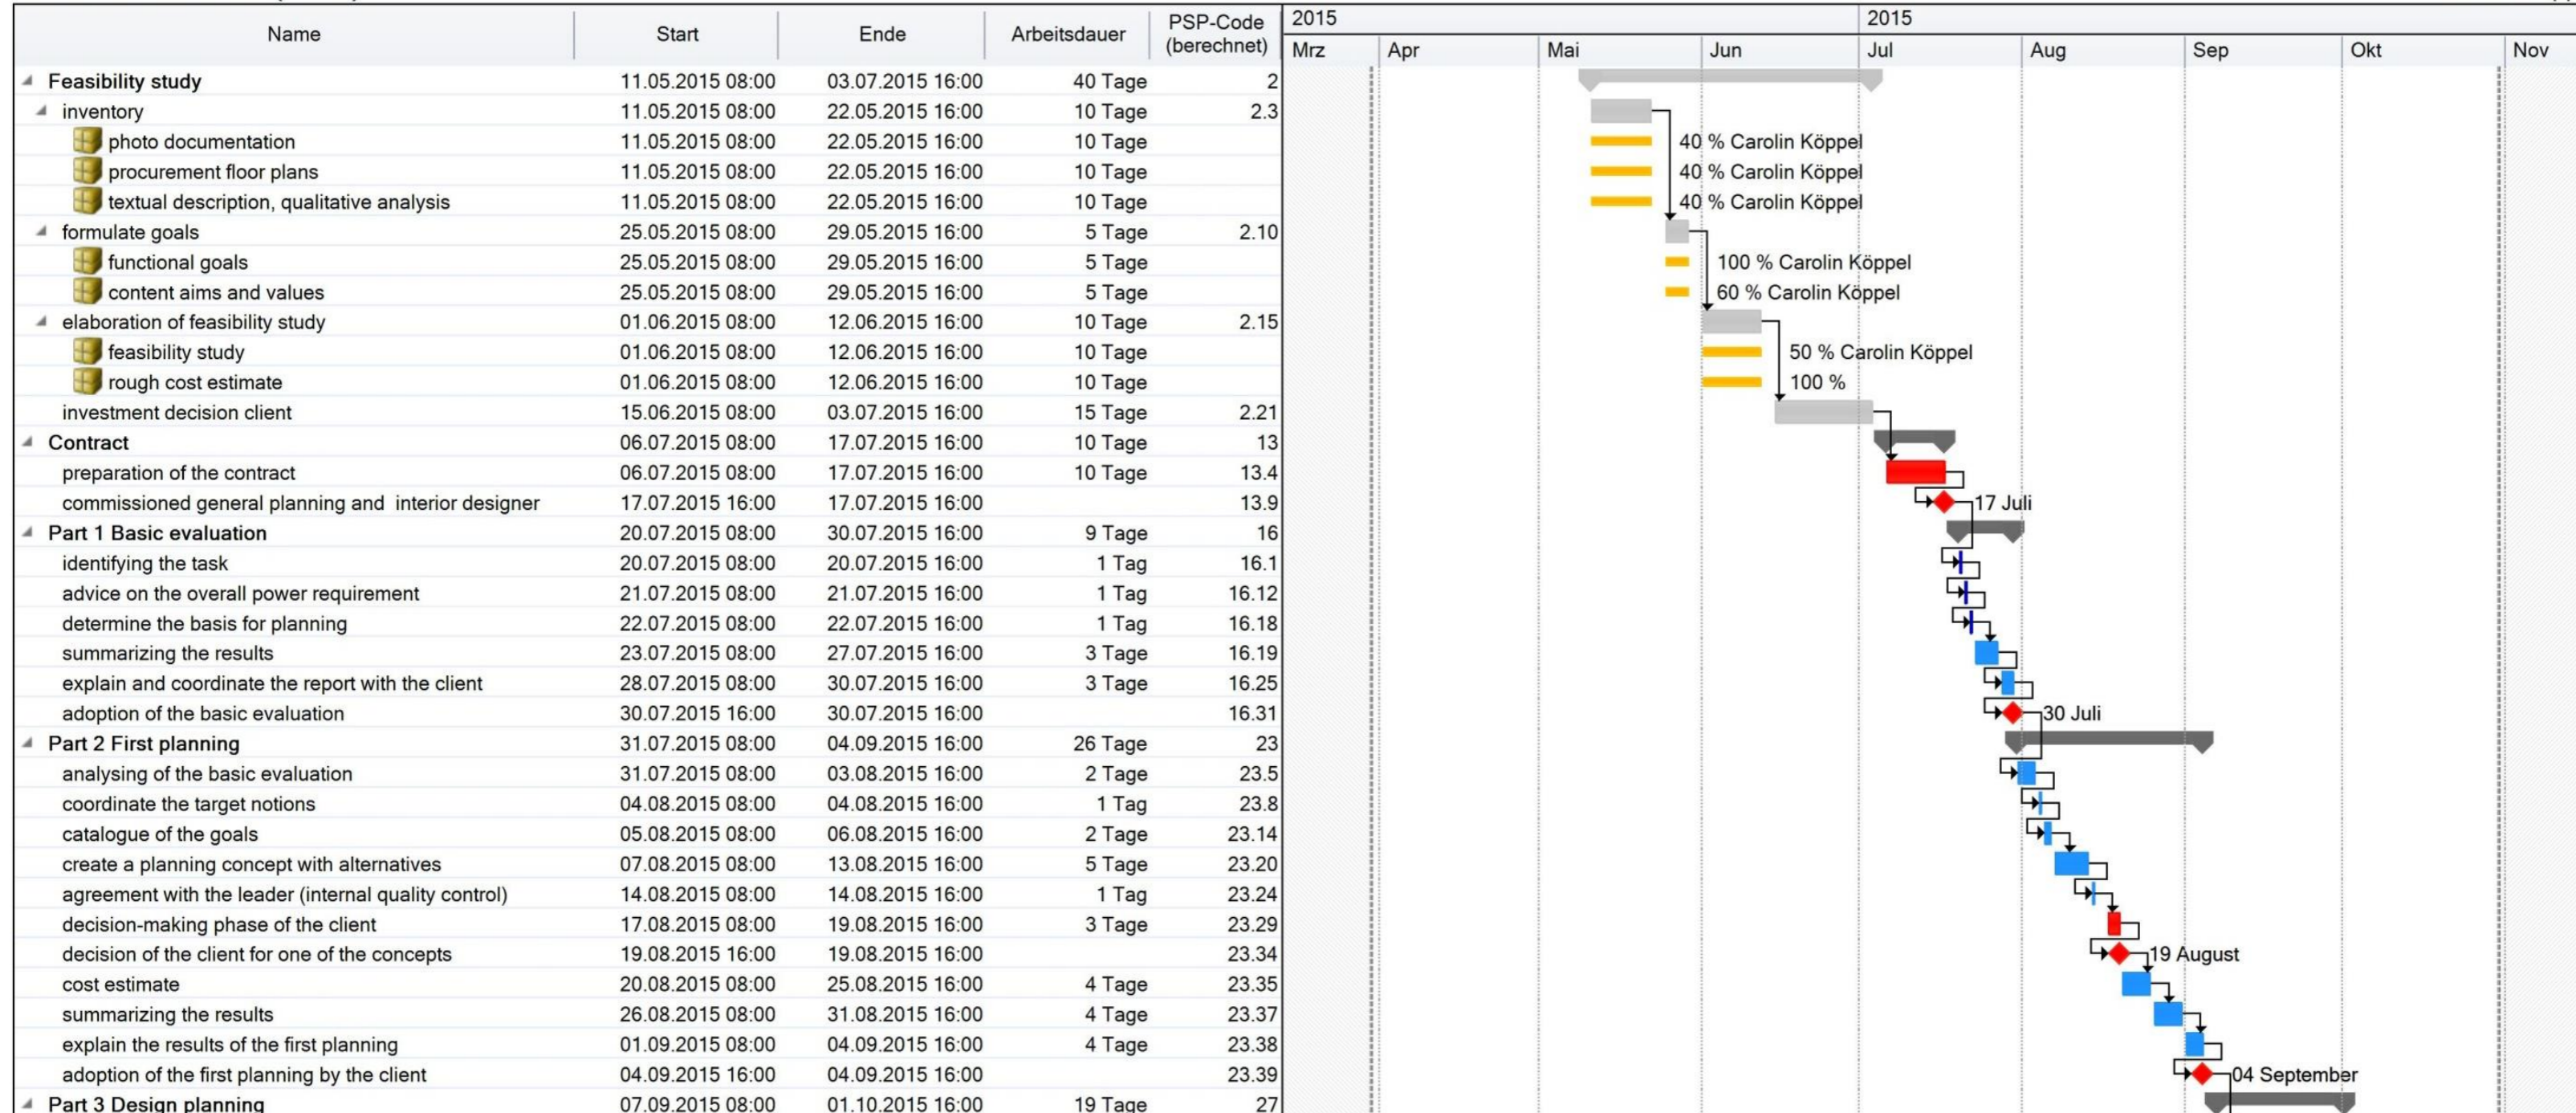



# InLoox PM – Evaluierung

- Prozesse vollständig aus QM abgebildet
  - QM Prozesse und Projektabwicklung laufen parallel
  - Laufender Soll-Ist Abgleich sehr leicht darstellbar
  - Integration in Outlook fördert tägliche Anwendung
  - Zeiterfassung auf Arbeitspakete ermöglicht Review
  - Hohe Flexibilität bei Informationsaufbereitung
- 
- Strukturierter Prozess als Akquisitionsinstrument (Alleinstellungsmerkmal)

## Zukünftige Potentiale:

- Budgetplanung und Controlling
